


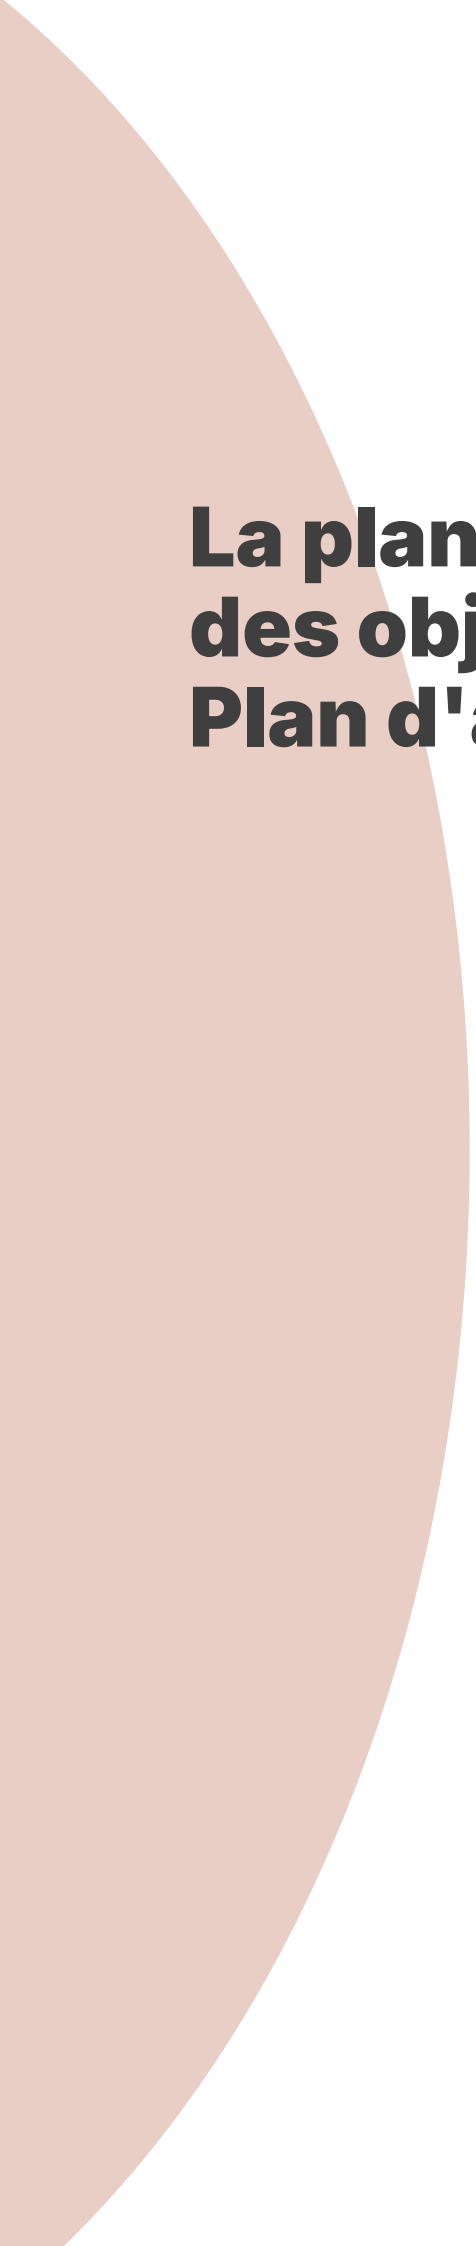

La planification des objectifs et du Plan d'action

Table des matières

I - Contexte	3
II - Définition des objectifs	4
A. Identification des objectifs principaux et méthode SMARTEF	4
B. Hiérarchisation des objectifs	5
III - Planification du plan d'action	6
A. Décomposition des objectifs en tâches et activités, définition des responsabilités et des rôles	6
B. Ressources du projet, séquençage et planification des activités	7
IV - Mise en situation du poste de manager	11
A. Mise en situation du poste de manager	11
B. Exercice : Quiz 2265	11
V - Essentiel	14
VI - Auto-évaluation	15
A. Exercice	15
B. Test	15
Solutions des exercices	18

I Contexte

Contexte

Ce cours revient sur la définition des objectifs et évoque les méthodes de mise en œuvre, de déploiement : focus sur la partie opérationnelle ! La stratégie étant construite et partagée avec l'ensemble des parties prenantes de l'organisation (management, direction, collaborateurs), il s'agit ensuite de s'interroger sur la réalisation concrète, sur le terrain.

Comment planifier les objectifs et les plans d'action qui en découlent ? Telle sera la question « *fil rouge* » de ce cours. Nous reviendrons sur l'importance de la planification des objectifs dans une organisation (entreprise ou autre écosystème) afin d'optimiser la mise en place des plans d'action.

À la fin du cours, des mises en situation seront proposées, elles seront jouées par des acteurs, qui reprendront les principes présentés.

II Définition des objectifs

A. Identification des objectifs principaux et méthode SMARTEF

L'une des méthodes les plus reconnues, en management, est de construire les objectifs en les hiérarchisant. Ainsi, il convient d'établir les objectifs principaux du projet en premier lieu. Ensuite, en appliquant la logique l'entonnoir (ou de la pyramide inversée), il est possible de déterminer, d'en déduire les objectifs mineurs ou secondaires. Cela n'est possible qu'à la condition de maîtriser les axes stratégiques : la stratégie globale de l'entreprise (ou de l'organisation, de façon générale) étant elle-même re-travaillée en stratégies de divisions, selon les équipes, les pôles de compétences. La première question à se poser, sans doute, est de définir clairement ce que l'on souhaite accomplir à travers ces objectifs. Autrement dit, il faut sonder l'intention derrière chaque objectif : Pourquoi ? Quels résultats/améliorations souhaite-t-on obtenir ? En quoi cela contribuera-t-il au projet stratégique global ?

Une autre méthode, pour identifier les objectifs principaux en lien avec la stratégie, est de procéder par champ thématique. Ainsi, il est possible de considérer différents sous-thèmes ou catégories d'actions à mener : quels objectifs concernent la finance, le budget ? Quels objectifs sont en lien avec le marketing ? En lien avec l'équipe commerciale ? Etc.

Ou encore, procéder par une logique de zones géographiques, particulièrement pertinente pour le management des forces de vente. Ainsi, les objectifs (en termes de chiffre d'affaires, par exemple) ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes selon les régions. Il peut y avoir une logique de territoire à déployer, et dans ce cas, la stratégie est à « traduire » de façon opérationnelle zone par zone.

Quelle que soit la méthode retenue, il faut veiller à garder une étroite cohérence entre les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels principaux. Les seconds étant au service des premiers. Les objectifs opérationnels secondaires sont une déclinaison (thématique ou chronologique) des objectifs principaux.

Méthode

Après la phase de détermination des objectifs opérationnels, qu'ils soient prioritaires ou secondaires, il est possible d'appliquer l'approche SMART (ou SMARTEF). Celle-ci permet de vérifier que les objectifs sont clairs, quantifiables et alignés sur les contraintes et les délais notamment. Si ce n'est pas le cas, l'approche aura permis de re-travailler les objectifs pour les rendre SMART. En effet, cela assure une planification efficace.

Alors, **qu'est-ce qu'un objectif SMARTEF ?** **Spécifique**, l'objectif doit permettre une totale compréhension et adhésion de tous. Si l'objectif est spécifique, il ne permet aucune ambiguïté sur la direction à prendre et l'intention sous-jacente. **Mesurable**, l'objectif doit être évalué, et donc évaluable (de façon quantitative et/ou qualitative). **Atteignable**, l'objectif doit encourager l'engagement et renforcer la motivation. S'il peut être challengeant pour les équipes, il doit néanmoins rester atteignable. **Réaliste**, l'objectif doit s'inscrire dans un contexte donné ; en ce sens, il prend en considération les contraintes éventuelles. **Temporellement** défini, l'objectif doit aider à la projection des équipes ; ainsi, il doit être atteint avant une date donnée (deadline) et/ou indiquer une durée de réalisation. **Écologique**, l'objectif doit par ailleurs correspondre aux valeurs environnementales actuelles. De cette façon, la réalisation de l'objectif ne peut aller à l'encontre des enjeux écologiques, éthiques et ceux de la RSE de façon générale. La notion d'écologie peut aussi être entendue dans le sens de l'écosystème de l'organisation, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs internes et externes. Enfin, l'objectif doit être « **Fun** ». Ce septième et dernier critère de la méthode SMARTEF peut paraître plus étonnant, mais un objectif source de plaisir et d'épanouissement sera plus facilement accepté par les équipes.

La méthode SMARTEF, ainsi détaillée, permet une double lecture des objectifs, et facilite le pilotage opérationnel par le management.

B. Hiérarchisation des objectifs

Lorsque la stratégie globale est construite, décidée et partagée avec les acteurs, et que les objectifs opérationnels (prioritaires et secondaires) ont été déterminés, il convient de procéder à leur hiérarchisation. Cela permet de les classer en fonction de leur importance et de leur impact sur le projet. Cette hiérarchisation aide à établir des priorités claires pour la planification et l'allocation des ressources.

L'étape de la hiérarchisation peut également intervenir en amont : avant de décliner les objectifs prioritaires en objectifs secondaires. La hiérarchisation se basera alors uniquement sur les grands axes indiqués par les objectifs prioritaires.

Cette étape reste cependant optionnelle, selon le projet, son envergure, l'abondance des moyens alloués ou non, la durée de celui-ci, entre autres paramètres. En effet, pour un projet modeste ou ayant une exécution rapide dans le temps, prioriser, hiérarchiser peut ne pas avoir de sens. De même, l'ensemble des objectifs peuvent être menés de front par plusieurs équipes, éventuellement pluri-disciplinaires (le marketing et les forces de vente, par exemple). Sauf dans le cas d'un projet « à tiroirs » dans lequel le premier objectif, la première phase doit être réalisée avec succès pour permettre à la seconde étape de démarrer, et ainsi de suite jusqu'à complète réalisation.

Si, en revanche, les moyens nécessaires à la mise en place sont restreints (effectifs insuffisants, budget incomplet, manque de moyens de communication, compétences inadaptées ou autre), il peut être intéressant de déterminer les objectifs sur lesquels les efforts devront être concentrés en priorité.

Pour hiérarchiser, il peut être intéressant de s'appuyer sur des questions-guides : quels seraient les conséquences à ne pas agir sur la problématique, les risques encourus ? Quel est le degré de faisabilité ? Quel serait le gain à travailler sur cette problématique en priorité ? Une fois ces questions posées, et les réponses construites, l'on peut éventuellement pondérer chaque critère, c'est-à-dire lui affecter un poids, un coefficient.

Synthèse

Manager par objectifs, cela ne s'improvise pas. Pour les légitimer, les rendre crédibles et acceptables, et surtout engager la motivation de tous les collaborateurs, il est possible de suivre une voire plusieurs méthodes pour les construire.

Le **management par objectifs** concerne bien entendu les forces de vente qui, de par la nature même de leur métier, doivent atteindre des objectifs. Mais pas seulement. **Fixer des objectifs** peut également s'appliquer à la **gestion de projet**, et ce dans plusieurs domaines : l'IT, le marketing, la création de sites web, les RH, et d'autres. Même si les objectifs semblent occuper une place prépondérante dans le monde professionnel, il convient de les définir avec précision, ce qui nécessite **d'engager un travail de réflexion**.

Les **objectifs opérationnels** sont fonction de la stratégie décidée en amont. Ces objectifs peuvent être classés de différentes façons : on distingue ainsi les **objectifs prioritaires** qui donneront lieu, éventuellement, aux **objectifs secondaires**, plus petits. Selon la taille et la nature du projet, il est possible de **hiérarchiser les objectifs**, de les classer par ordre d'importance ou par ordre chronologique. Méthode pertinente notamment lorsque les moyens sont limités.

D'autre part, la **méthode SMARTEF** permet de vérifier si les objectifs remplissent les 7 critères suivants : **spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, écologique et fun**.

Des objectifs bien construits sont à la base du management, et de la relation de confiance entre managers et collaborateurs.

III Planification du plan d'action

A. Décomposition des objectifs en tâches et activités, définition des responsabilités et des rôles

Chaque objectif est décomposé en tâches et activités spécifiques nécessaires à sa réalisation. Cela permet d'avoir (et de partager avec les équipes) une vision détaillée des étapes à franchir et des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. C'est ce que l'on appelle la planification du plan d'action. De façon très concrète, et à un niveau opérationnel supérieur, le manager affecte, à chaque objectif, un certain nombre de tâches et d'activités. Ce plan d'action comprend également des informations, des précisions, qui s'inspirent de l'hexamètre de Quintilien : **QQOQCCP** correspondant aux questions **Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi**.

- **Quoi** : la mission, la tâche, l'activité.
- **Qui** : la ou les personne(s)-ressource(s) en charge de réaliser ou d'exécuter les tâches, éventuellement la personne auprès de qui se fera le reporting (qui porte donc la responsabilité).
- **Où** : le territoire géographique sur lequel portera l'action.
- **Quand** : la date de démarrage, la deadline, la durée, éventuellement les jalons intermédiaires.
- **Comment** : les moyens alloués (financiers, humains, formation, etc.).
- **Combien** : le nombre de personnes mobilisées, le CA à atteindre (ou le résultat chiffré), etc.
- **Pourquoi** : l'enjeu de l'action, le lien avec l'objectif.

Dans le plan d'action, le manager intègre également les KPIs ou les indicateurs de performance. Autrement dit, en se référant au système SMARTEF, il détermine les indicateurs les plus à même de mesurer (de façon qualitative ou quantitative) la progression du projet. C'est notamment de par ces KPIs qu'il pourra piloter le projet et les équipes : en soulignant les réussites (et en témoignant sa reconnaissance), en proposant des plans d'actions correctifs si besoin, en échangeant sur les difficultés rencontrées. En ce sens, le plan d'action est, pour le management, un véritable tableau de bord de l'activité.

Le tableau de bord de l'activité permet donc de définir clairement les responsabilités et les rôles de chaque membre de l'équipe : ainsi, chacun sait ce qu'on attend de lui. Pour le manager, cela lui permet de voir les liens à créer, les synergies à encourager entre les différents collaborateurs afin de fluidifier, faciliter la coordination et la collaboration.

Définir les responsabilités et les rôles de chacun au sein de l'équipe renvoie à plusieurs enjeux pour le manager. On voit ici qu'au-delà des compétences métier, des compétences techniques (des compétences commerciales pour un manager commercial, par exemple), le manager doit également avoir des compétences en gestion des hommes (et donc en RH).

Comment définir la responsabilité (ou les responsabilités) au sein d'un projet ? La responsabilité est « *l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position* » *l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position* » ». Autrement dit, porter la responsabilité d'un projet, d'une mission ou d'une activité, cela signifie, pour la personne responsable, de porter la charge de la réalisation ou de la non-réalisation. C'est à elle que revient l'obligation de tout mettre en œuvre pour que le projet (ou une partie du projet) soit un succès. Il convient ici de préciser, en amont, si cette personne a une obligation de moyens ou de résultats. Le poids de la responsabilité en sera tout à fait différent. Ainsi, l'obligation de moyens est « *une obligation en vertu de laquelle le [professionnel] doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé, en ayant agi selon les règles de l'art* » *une obligation en vertu de laquelle le [professionnel] doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé, en ayant agi selon les règles de l'art* ». ». alors que

l'obligation de résultat « *consiste au devoir qu'a [le professionnel] d'effectuer sa mission jusqu'au bout. La réalisation de sa mission ne peut pas être réalisée que partiellement* ». Ce niveau de responsabilité est défini soit « *consiste au devoir qu'a [le professionnel] d'effectuer sa mission jusqu'au bout. La réalisation de sa mission ne peut pas être réalisée que partiellement* », dans le contrat de travail soit dans la lettre de mission, rédigée en amont du lancement du projet.

B. Ressources du projet, séquençage et planification des activités

Le manager doit identifier les ressources nécessaires, et ce pour chaque action du plan d'action. Les ressources peuvent être de nature diverse, et très différentes d'un projet à un autre. Cependant, il est d'usage de les catégoriser en 3 grandes familles :

- **Les ressources humaines** (les collaborateurs, en CDI, CDD, en stage, en alternance, en intérim ou les prestataires externes à l'entreprise, des experts métiers, des cabinets conseil).
- **Les ressources matérielles** (la mise à disposition de locaux, les équipements bureautiques et numériques, les véhicules pour réaliser des déplacements, etc.).
- **Les ressources financières** (le budget alloué au projet, éventuellement scindé en différentes lignes budgétaires).

Alors, comment identifier et allouer les différentes ressources (humaines, matérielles et financières) d'un projet ?

Il faut tout d'abord identifier les besoins (dans les 3 grandes familles de ressources), et les livrables attendus. Puis estimer la quantité de chaque ressource requise pour chaque tâche, en se basant (si possible) sur l'expérience passée (selon l'historique des projets). Ensuite, il convient de s'interroger sur la disponibilité de ces mêmes ressources au sein de l'organisation. Tenir compte également des contraintes budgétaires et des délais de livraison.

Se demander si toutes ces ressources doivent être mobilisées dans le même laps de temps, ou non. Cette question est particulièrement pertinente pour les ressources humaines : il est évident qu'un collaborateur mobilisé à 100 % de son temps sur le projet A ne pourra pas être mobilisé sur le projet B aux mêmes dates. Si ses compétences sont nécessaires pour les 2 projets A et B, alors il faut prioriser ces 2 projets selon leur degré d'urgence respectif.

Cette méthode permet au management de construire le plan de ressources, outil qui indique comment chaque ressource sera allouée aux différentes tâches tout au long du projet. Le pilotage permettra, enfin, d'assurer le suivi et de réaliser les ajustements nécessaires.

La construction et le pilotage d'un projet, qu'il soit géré et mis en œuvre par une seule ou plusieurs parties prenantes, *nécessite le séquençage et la planification des activités. Cette étape peut être réalisée avant ou après l'allocation des ressources. Il s'agit, au cours de cette étape, de déterminer l'ordre logique des tâches, d'estimer les délais et de définir les éventuelles dépendances entre les activités. On conclura avec la définition des KPIs liés.*

Déterminer l'ordre d'exécution permet d'optimiser la chronologie des activités pour minimiser les retards potentiels. Le risque, si cette chronologie n'est pas établie clairement, est de constater des périodes de latence, improductives, au cours du projet : des périodes pendant lesquelles les acteurs ne sont pas dans l'action, faute d'avoir l'information que « *c'est à eux de jouer* » !

Estimer les délais est également un enjeu de taille, dans la mesure où ils permettent ensuite d'établir un calendrier réaliste du projet. Comment estimer les délais, notamment dans le cadre de projets long-terme (plus d'un an, voire pluri-annuels) ? Plusieurs techniques existent, notamment l'estimation par analogie ou l'estimation paramétrique. La première, l'estimation analogique (ou comparative) consiste à identifier une réalisation passée comparable au projet actuel à estimer. Quant à la seconde, plus complexe mais également plus précise et plus fiable, elle se base sur des algorithmes et exige des compétences spécifiques.

Concernant les éventuelles dépendances entre les activités, il est essentiel de les repérer en amont afin que le projet progresse de manière fluide. Différents types de dépendances peuvent être détectées :

- Les dépendances de fin à début (ou en cascades) (A démarre lorsque B se termine).
- De début à début (A peut démarrer dès que B a démarré).
- De fin à fin (A ne peut pas se terminer avant que B ne soit terminée).
- De début à fin (A ne peut pas se terminer avant que B n'ait démarré).

Les indicateurs de performance ou KPIs permettront, comme leur nom l'indique, de mesurer la performance du projet : la performance des délais ou la performance des coûts, par exemple.

Mise en situation

Abordons ensemble un exemple fictif mais concret de détermination d'un plan d'action à partir d'une stratégie. La stratégie imaginée est celle-ci : améliorer la satisfaction client pour fidéliser la clientèle existante. Le commanditaire du projet est la Direction Commerciale.

L'objectif ici est **l'augmentation du taux de satisfaction client de 10 % d'ici la fin de l'année**.

Les forces de vente, et d'autres pôles de l'entreprise, sont donc mobilisées afin de réaliser l'objectif. Essayons maintenant de mettre en place un plan d'action reprenant plusieurs éléments : **les tâches, les responsables, les délais et les KPIs associés**.

Nous allons procéder pas à pas pour bien comprendre la logique et le déroulé chronologique.

Le faire dans un tableau est plus simple, reprenons donc les 4 éléments dans 4 colonnes distinctes.

Tâches	Responsables	Délais	KPIs

Interrogeons-nous tout d'abord sur **les différentes actions/tâches** à mener pour, in fine, améliorer le taux de satisfaction client. Nous pouvons **organiser un brainstorming d'équipes** afin de collecter toutes les idées, et éventuellement les réorganiser par ordre chronologique d'exécution dans un second temps.

Dans ce cas précis, nous pouvons remplir le tableau avec les tâches qui nous apparaissent évidentes :

- La collecte des commentaires clients : le service client est chargé de recueillir les commentaires clients via des enquêtes, des appels sortants et les avis publiés sur les réseaux sociaux.
- L'analyse des commentaires et l'identification des problèmes : le service marketing examine les commentaires collectés pour identifier les tendances et les problèmes récurrents. Il hiérarchise ensuite les problèmes à résoudre en fonction de leur impact sur la satisfaction client.
- L'élaboration d'un plan d'action : pour chaque problème identifié, l'équipe commerciale construit un plan d'action spécifiant les mesures correctives à prendre.
- La mise en œuvre des actions : les équipes concernées mettent en œuvre les actions définies dans les plans d'action.

- Le suivi de la satisfaction client : le service client continue de mesurer la satisfaction client à l'aide d'enquêtes régulières.
- L'évaluation et l'ajustement : à la fin de l'année, la Direction Commerciale, qui pilote le projet, évalue les progrès réalisés et ajuste la stratégie en conséquence.

Tâches	Responsables	Délais	KPIs
Collecte des commentaires clients	Service client		
Analyse des commentaires clients et hiérarchisation des problèmes	Service marketing		
Élaboration des plans d'actions	Service commercial		
Mise en œuvre des actions	Selon le service concerné, à définir		
Suivi de la satisfaction client	Service client		
Évaluation et ajustement	Direction Commerciale		

Maintenant que les tâches ont été identifiées et classées par ordre chronologique d'exécution, et que les responsables ont été également identifiés, la question du délai se pose.

L'idéal est de **réunir toutes les parties prenantes** pour mieux comprendre leur façon de procéder, et de définir les délais de façon participative (sans les imposer). Tout en gardant à l'esprit que la deadline est déjà connue et partagée : 1 an.

Ensuite, il ne restera qu'à **déterminer l'indicateur (ou les indicateurs)** les plus à même de mesurer la performance de la tâche.

Par exemple, ici le niveau de satisfaction client peut tout à fait être mesuré par le **NPS ou Net Promoter Score** qui est un indicateur reconnu, fiable dans le domaine marketing. Ce score mesure la propension des clients à recommander l'entreprise.

Tâches	Responsables	Délais	KPIs
Collecte des commentaires clients	Service client	4 semaines	Nb de commentaires collectés
Analyse des commentaires clients et hiérarchisation des problèmes	Service marketing	2 semaines	Rapport d'analyse et liste des pb
Élaboration des plans d'actions	Service commercial	2 semaines	Plan d'action/pb
Mise en œuvre des actions	Selon le service concerné, à définir	3 semaines	État d'avancement des projets
Suivi de la satisfaction client	Service client	6 mois	NPS
Évaluation et ajustement	Direction Commerciale	12 mois	+10 % taux de satisfaction client

La Direction Commerciale pourra ainsi piloter le projet et suivre l'avancement et la réalisation.

Synthèse

L'ingénierie de projet nécessite donc un certain nombre d'étapes, en amont du pilotage et du déploiement du projet lui-même.

Lorsque les objectifs opérationnels, prioritaires et secondaires, ont été établis, **le chef de projet doit encore affiner son analyse du projet**. Il doit d'une part préciser quelles seront les **ressources du projet**, qu'elles soient humaines, matérielles ou encore financières. Cette allocation peut donner lieu à **des phases de négociation avec la direction N+1 ou avec les opérationnels N-1** qui estimerait ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour être en réussite sur le projet.

Ensuite, le chef de projet procède au **séquençage et à la planification des activités**. Le séquençage consiste à « **raconter l'histoire** » du projet, avec un début, une fin et des étapes intermédiaires. Cette étape permet de projeter les équipes, de leur **montrer la cohérence du projet global**. Il faut ici veiller à **d'éventuelles dépendances** entre une et d'autres étapes du projet.

Quant à la planification des activités, elle répond à une logique de temps. Elle permet d'organiser le travail des équipes, de coordonner l'action et de l'inscrire dans l'agenda.

Manager une équipe, un projet, cela requiert des compétences certaines en gestion, en ingénierie de projet et en leadership.

IV Mise en situation du poste de manager

A. Mise en situation du poste de manager

B. Exercice : Quiz 2265

[solution n°1 p. 18]

Retrouvons nos deux managers et répondez aux questions suivantes :

Claire



Charlotte



Question 1

Quelle est la stratégie de développement abordée dans cet exercice de formation ?

Expansion des bureaux internationaux

Amélioration des processus de fabrication

Restructuration des départements marketing

Développement des ventes via de nouveaux canaux de distribution

Exercice

Quel est l'avantage de hiérarchiser les objectifs dans une entreprise ?

Pour impressionner la direction

Pour permettre une meilleure allocation des ressources et une concentration sur les objectifs prioritaires

Pour rendre les réunions plus intéressantes

Pour éviter toute discussion autour des objectifs

Question 3

Quelle est la principale différence entre l'approche de Claire et celle de Charlotte de la définition des objectifs mensuels ?

Charlotte ne hiérarchise pas les objectifs, tandis que Claire insiste sur la priorisation pour atteindre les objectifs organisationnels.

Claire se concentre sur les objectifs individuels, tandis que Charlotte hiérarchise les objectifs en fonction de la stratégie globale

Charlotte ne fixe que des objectifs SMART, tandis que Claire se concentre sur des objectifs spécifiques à la stratégie globale

Il n'y a pas de différence significative entre les approches des deux managers.

Question 4

Quelle est la période typique pour la définition de la stratégie, des objectifs et des plans d'action, respectivement ?

Stratégie : Mensuelle, Objectifs: Annuelle, Plans d'action : Hebdomadaire

Stratégie : Pluriannuelle, Objectifs: Mensuelle, Plans d'action : Trimestrielle

Stratégie : Quotidienne, Objectifs: Annuelle, Plans d'action : Hebdomadaire

Stratégie : Annuelle, Objectifs: Mensuelle, Plans d'action : Trimestrielle

Question 5

Pourquoi est-il souligné que l'expérience de Claire peut être précieuse mais ne peut pas être simplement transposée à la situation de Charlotte ?

Parce que les deux ont des approches totalement différentes

Parce que la situation de chaque entreprise est unique et requiert des plans d'action adaptés

Parce que Charlotte ne peut pas comprendre les conseils de Claire

Parce que la stratégie de Claire était un échec total

V Essentiel

Si le management est généralement défini comme étant une technique de gestion et d'organisation, cela s'illustre particulièrement dans le cadre du management de projet. Il s'agit en effet de recourir à des méthodes, des outils et process afin de gérer les ressources (humaines, matérielles et financières). En somme, cela revient à organiser, planifier, structurer l'activité des équipes afin de répondre aux exigences et d'atteindre les objectifs, opérationnels et stratégiques.

VI Auto-évaluation

A. Exercice

Logi'Plus est une start-up innovante spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour les PME. Fondée il y a deux ans par un groupe de passionnés de la technologie, l'entreprise a connu une croissance rapide et souhaite désormais élaborer une stratégie solide pour les années à venir. Elle réalise une analyse SWOT avant de planifier les objectifs commerciaux et le plan d'action correspondant.

FORCES Expertise technique solide. Bonne réputation dans l'industrie.	FAIBLESSES Dépendance à l'égard de quelques clients clefs. Offre de produits peu diversifiée.
OPPORTUNITES Augmentation de la demande pour les solutions logicielles dans les PME. Détection d'opportunités d'expansion internationale.	MENACES Concurrence accrue de grandes entreprises technologiques. Risques liés à la sécurité des données (RGPD).

Question 1

[solution n°2 p. 20]

En vous basant sur le SWOT, proposez de définir les objectifs commerciaux suivants pour les deux prochaines années.

Question 2

[solution n°3 p. 20]

Et construisez le plan d'action commerciales correspondant (en remplissant le tableau suivant à 2 colonnes).

Imaginez maintenant que le SWOT proposé ne soit pas celui d'une start-up mais celui d'un groupe international de + 10 000 collaborateurs.

Question 3

[solution n°4 p. 20]

Quelle(s) solution(s) auriez-vous alors proposées ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 21]

Question 1

Qu'est-ce que la méthode SMARTEF vise à vérifier pour les objectifs ?

La couleur des objectifs

La taille des objectifs

La satisfaction des collaborateurs

7 critères, dont la spécificité, la mesure, l'atteignabilité, le réalisme, le caractère temporel, l'aspect écologique et le côté fun

Question 2

Qui est responsable de la collecte des commentaires ?

Service marketing

Direction Commerciale

Service client

Service informatique

Question 3

Quel indicateur est utilisé pour mesurer le niveau de satisfaction client dans le plan d'action ?

NPS (Net Promoter Score)

ROI (Return On Investment)

KPI (Key Performance Indicator)

CPU (Customer Performance Index).

Exercice

Quelle étape permet d'organiser le travail des équipes, de coordonner l'action et de l'inscrire dans l'agenda dans le contexte de l'ingénierie de projet ?

La collecte des commentaires clients

Le séquençage et la planification des activités

L'évaluation et l'ajustement

La hiérarchisation des objectifs

Question 5

Quelle est la première étape à suivre lors de la mise en place d'un plan d'action pour améliorer la satisfaction client dans l'exemple donné ?

Hiérarchiser les objectifs

Évaluer et ajuster la stratégie

Collecter des commentaires clients

Définir la stratégie de projet et son commanditaire

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 11]

Question 1

Quelle est la stratégie de développement abordée dans cet exercice de formation ?

Expansion des bureaux internationaux

Amélioration des processus de fabrication

Restructuration des départements marketing

✓ Développement des ventes via de nouveaux canaux de distribution



Effectivement, cette mise en situation se concentre sur une stratégie de développement des ventes à travers de nouveaux canaux de distribution.

Exercice

Quel est l'avantage de hiérarchiser les objectifs dans une entreprise ?

Pour impressionner la direction

✓ Pour permettre une meilleure allocation des ressources et une concentration sur les objectifs prioritaires

Pour rendre les réunions plus intéressantes

Pour éviter toute discussion autour des objectifs



La vidéo souligne l'importance de hiérarchiser les objectifs pour permettre une meilleure allocation des ressources et une concentration sur les objectifs prioritaires.

Question 3

Quelle est la principale différence entre l'approche de Claire et celle de Charlotte de la définition des objectifs mensuels ?

✓ Charlotte ne hiérarchise pas les objectifs, tandis que Claire insiste sur la priorisation pour atteindre les objectifs organisationnels.

Claire se concentre sur les objectifs individuels, tandis que Charlotte hiérarchise les objectifs en fonction de la stratégie globale

Charlotte ne fixe que des objectifs SMART, tandis que Claire se concentre sur des objectifs spécifiques à la stratégie globale

Il n'y a pas de différence significative entre les approches des deux managers.

🔍 L'exemple montre que la seconde manager énumère les objectifs sans hiérarchisation, tandis que la première propose une approche plus axée sur la stratégie en priorisant les objectifs.

Question 4

Quelle est la période typique pour la définition de la stratégie, des objectifs et des plans d'action, respectivement ?

Stratégie : Mensuelle, Objectifs: Annuelle, Plans d'action : Hebdomadaire

✓ Stratégie : Pluriannuelle, Objectifs: Mensuelle, Plans d'action : Trimestrielle

Stratégie : Quotidienne, Objectifs: Annuelle, Plans d'action : Hebdomadaire

Stratégie : Annuelle, Objectifs: Mensuelle, Plans d'action : Trimestrielle

🔍 La stratégie est généralement définie sur plusieurs années (pluriannuelle), les objectifs sur une période de quelques mois à un an, et les plans d'action sur quelques semaines à un trimestre.

Question 5

Pourquoi est-il souligné que l'expérience de Claire peut être précieuse mais ne peut pas être simplement transposée à la situation de Charlotte ?

Parce que les deux ont des approches totalement différentes

✓ Parce que la situation de chaque entreprise est unique et requiert des plans d'action adaptés

Parce que Charlotte ne peut pas comprendre les conseils de Claire

Parce que la stratégie de Claire était un échec total



Bien que les situations soient similaires, chaque entreprise a ses spécificités. Les conseils de Claire peuvent fournir des idées précieuses, mais une adaptation est nécessaire en fonction de la réalité actuelle de Charlotte.

[exercice p. 15] **Solution n°2**

L'on peut imaginer que Logi'Plus oriente ses objectifs commerciaux de la façon suivante :

- Augmentation des revenus : augmenter les revenus de l'entreprise de 50 % d'ici la fin de l'année 2024 en ciblant de nouveaux segments de marché et en augmentant la part de marché chez les clients existants.
- Diversification des produits : lancer deux nouvelles solutions logicielles complémentaires pour élargir la gamme de produits.
- Réduction de la dépendance aux clients clés : réduire la dépendance à l'égard des trois principaux clients de l'entreprise de 40 % d'ici la fin de 2024 en développant une clientèle plus diversifiée.

[exercice p. 15] **Solution n°3**

Les objectifs commerciaux précédemment définis pourraient se décliner selon le plan d'action suivant :

Objectifs	Actions/tâches correspondantes
Expansion de la clientèle	Recruter un directeur des ventes pour développer de nouveaux marchés et piloter la stratégie commerciale Mettre en place un programme de fidélisation clients pour augmenter la rétention des clients existants
Diversification des produits	Constituer une équipe R&D pour concevoir de nouveaux produits Lancer une campagne de marketing pour promouvoir les nouvelles solutions
Réduction de la dépendance aux clients clés	Identifier de nouveaux prospects

[exercice p. 15] **Solution n°4**

Dans ce contexte différent, on peut imaginer que l'entreprise souhaite opter pour une solution de fusion/acquisition de structures plus petites (des start'ups éventuellement) afin d'acquérir des compétences nouvelles, un portefeuille de clients et ainsi intégrer de nouveaux marchés. Et/ou racheter des concurrents de taille plus importante.

Dans ce cas pratique, il est question de réfléchir à la définition des objectifs de développement commercial d'une start'up. Et de construire le plan d'action en cohérence avec ces mêmes objectifs. Voyons ensemble comment procéder.

Le cas nous donne un certain nombre d'informations. Ainsi Logi'Plus est une start-up dont l'activité s'illustre dans le développement de solutions logicielles pour les PME. Elle a été fondée il y a deux ans et a connu une croissance rapide. Son objectif stratégique est aujourd'hui **d'élaborer une vraie stratégie commerciale**, de structurer son fonctionnement. Elle a d'ailleurs réalisé une analyse SWOT pour prendre les meilleures décisions.

Quelles informations nous donne le SWOT ? Logi'Plus dispose de **compétences techniques** solides et d'une bonne réputation. De plus, elle a détecté des **opportunités de développement** sur le marché international. Ses lacunes résident principalement aujourd'hui dans le **nombre restreint de clients** (qui peuvent la mettre en danger de survie si l'un d'eux met un terme au contrat) et le **nombre restreint de produits dans son catalogue**.

Au vu des opportunités détectées, il semble judicieux de **capitaliser sur ses forces** pour prendre de nouveaux marchés, tout en fidélisant la clientèle existante, et concevoir de nouveaux produits.

C'est tout naturellement donc que s'impose la nécessité de **recruter un Directeur Commercial** : celui-ci structurera et animera la nouvelle politique commerciale de développement. Tandis que **la nouvelle équipe R&D** sera chargée de concevoir de nouveaux produits, en réponse au marché.

Dans le cas d'une entreprise internationale, ayant plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, on peut imaginer **qu'un service Commercial et un autre R&D existent déjà**. L'expansion sur le marché peut se faire par la fusion-acquisition de concurrents et/ou de structures plus petites.

Ce cas nous montre que, même si les objectifs sont les mêmes, la réalisation opérationnelle, avec le pilotage du plan d'action, diffère d'un contexte d'entreprise à un autre.

Solution n°5

[exercice p. 15]

Question 1

Qu'est-ce que la méthode SMARTEF vise à vérifier pour les objectifs ?

La couleur des objectifs

La taille des objectifs

La satisfaction des collaborateurs

✓ 7 critères, dont la spécificité, la mesure, l'atteignabilité, le réalisme, le caractère temporel, l'aspect écologique et le côté fun



La méthode SMARTEF vise à s'assurer que les objectifs sont Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définis, Écologiques et amusants.

Question 2

Qui est responsable de la collecte des commentaires ?

Service marketing

Direction Commerciale

✓ Service client

Service informatique



Le service client est chargé de recueillir les commentaires clients via des enquêtes, des appels sortants et les avis publiés sur les réseaux sociaux.

Question 3

Quel indicateur est utilisé pour mesurer le niveau de satisfaction client dans le plan d'action ?

✓ NPS (Net Promoter Score)

ROI (Return On Investment)

KPI (Key Performance Indicator)

CPU (Customer Performance Index).



Dans le plan d'action, le NPS est utilisé comme indicateur pour mesurer le niveau de satisfaction client. Le NPS mesure la propension des clients à recommander l'entreprise.

Exercice

Quelle étape permet d'organiser le travail des équipes, de coordonner l'action et de l'inscrire dans l'agenda dans le contexte de l'ingénierie de projet ?

La collecte des commentaires clients

✓ Le séquençage et la planification des activités

L'évaluation et l'ajustement

La hiérarchisation des objectifs



Le séquençage raconte l'histoire du projet, montrant la cohérence globale, tandis que la planification des activités organise le travail des équipes et l'inscrit dans l'agenda.

Question 5

Quelle est la première étape à suivre lors de la mise en place d'un plan d'action pour améliorer la satisfaction client dans l'exemple donné ?

Hiérarchiser les objectifs

Évaluer et ajuster la stratégie

Collecter des commentaires clients

✓ Définir la stratégie de projet et son commanditaire



La première étape dans l'exemple est de définir la stratégie de projet, qui consiste à améliorer la satisfaction client pour fidéliser la clientèle existante, avec pour commanditaire la Direction Commerciale.
