

Le suivi et l'ajustement des objectifs

Table des matières

I. Contexte	3
II. Importance du suivi et de l'ajustement des objectifs	3
A. Suivre et ajuster les objectifs	3
III. Processus de suivi des objectifs	4
A. Processus de suivi des objectifs.....	4
B. Exercice : Quiz.....	8
IV. Processus d'ajustement des objectifs	9
A. Processus d'ajustement des objectifs	9
V. L'essentiel	12
VI. Auto-évaluation	12
A. Exercice	12
Solutions des exercices	12

I. Contexte

Contexte

Nous reviendrons ici sur les objectifs SMARTEF et les plans d'action, et nous amènerons la notion d'ajustement des objectifs. Cet ajustement peut intervenir suite à un décalage entre le plan d'action et sa réalisation, ou suite à un changement d'environnement, par exemple. Si l'ajustement peut concerner le plan d'action (comme vu précédemment), il peut en effet également concerner la définition de l'objectif.

Le cours proposera des mises en situation qui seront jouées par des acteurs, afin de reprendre et d'illustrer les principes présentés. On évoquera l'organisation au sens large, les managers pouvant évoluer dans d'autres écosystèmes, comme les associations ou la Fonction Publique, par exemple.

II. Importance du suivi et de l'ajustement des objectifs

A. Suivre et ajuster les objectifs

Rappelons ici l'importance du suivi et de l'ajustement des objectifs pour une gestion efficace des projets et des tâches. Le suivi des projets, des réalisations, finales et intermédiaires, permet de mesurer la progression du projet, de vérifier le respect des délais et des coûts, et plus globalement, la conformité au cahier des charges initial. En cas de non-respect, ou de difficulté rencontrée, il est alors envisageable, selon le contexte et les moyens alloués, de proposer un ajustement. Cet ajustement permet de considérer la réalité opérationnelle du projet, d'intégrer de nouveaux paramètres afin de re-considérer tout ou partie du projet et le mener jusqu'à son terme. En ce sens, les processus mis en place garantissent l'optimisation des résultats obtenus. Pour rappel, un processus est « *un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté* » *« un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté »* ». Autrement dit, l'un des facteurs-clefs de succès d'un projet est la conception des processus qui le sous-tendent : la façon dont les actions sont orchestrées entre elles, le délai existant entre deux ou plusieurs actions successives, la synergie des compétences, etc.

L'ajustement des objectifs peut se situer au niveau opérationnel (dans le déploiement concret du projet) ou stratégique (en lien avec tout ou partie de la stratégie globale de l'organisation). Le suivi permet de détecter les incohérences et les non-faisabilités et d'alerter suffisamment tôt pour proposer un ajustement. Cet ajustement peut alors consister à changer de direction ou de décaler la réalisation dans le temps, faute de ressources, par exemple. C'est ainsi que la crise sanitaire Covid-19 est venue perturber les projets des entreprises en 2020, et que celles-ci ont dû ré-ajuster leurs projets à la fois stratégiques et opérationnels.

Pourquoi effectuer le suivi et l'ajustement des objectifs ? Rappelons ici la nécessité de rester adaptable face aux changements. Ceux-ci peuvent être de plusieurs ordres :

- Des changements de stratégie globale (perte d'un marché, ou au contraire détection d'une nouvelle opportunité)
- Des changements de réglementation (l'obligation de s'adapter à une contrainte, à une norme, à une loi, etc.)
- Des changements environnementaux (la prise en compte du changement climatique et de ses effets)
- Des changements RH (la survenue d'une grève, par exemple)
- Et d'autre

Ne pas intégrer les changements dans les plans d'actions serait un non-sens. Les éviter serait une fiction. Aussi, il convient de composer avec ces changements et mettre en place les modifications nécessaires. Le suivi permettra ensuite de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les écarts et, éventuellement, de prendre des mesures correctives pour améliorer les performances : celles de l'organisation, celles de l'équipe et celles des collaborateurs, à titre individuel.

Selon le dicton « *À l'impossible nul n'est tenu.* », autrement dit il est inutile de vouloir avancer en dépit du contexte (légal, humain, environnemental, culturel, etc.) qui entoure l'organisation, et a fortiori le projet. Au contraire, le management doit faire preuve de raison et engager ses équipes dans des projets cohérents, en lien avec les ressources disponibles. D'ailleurs, réaliser une matrice SWOT (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) prend ici tout son sens : en amont du projet mais aussi, selon les problématiques et changements rencontrés, en cours de projet.

Assurer un suivi régulier des projets conduits, cela présente plusieurs avantages :

- **Amélioration de la prise de décision.** Un reporting régulier permet de faire le point sur la timeline du projet, d'estimer le temps et les ressources nécessaires à sa finalisation. De cette façon, il est possible de faire des projections intermédiaires et de prendre, si besoin, des décisions pour orienter (ou ré-orienter) certains axes stratégiques.
- **Optimisation des ressources.** Le reporting est une photo à l'instant T des ressources utilisées, et de celles nécessaires à la finalisation du projet. Aussi, il devient possible, de par cette connaissance de la situation, d'améliorer les performances en utilisant mieux les ressources disponibles, en améliorant leur rendement. C'est ce que l'on appelle l'efficacité : celle-ci peut être humaine, financière ou matérielle. L'efficacité se définit ainsi : « *l'efficacité est la consommation des ressources utilisées dans la production d'un résultat. C'est un composant important de la mesure de la performance. On parle parfois d'efficacité matérielle. Elle se mesure à partir de rapports entre les résultats obtenus et les ressources utilisées* » *L'efficacité est la consommation des ressources utilisées dans la production d'un résultat. C'est un composant important de la mesure de la performance. On parle parfois d'efficacité matérielle. Elle se mesure à partir de rapports entre les résultats obtenus et les ressources utilisées* ».
- Flexibilité et adaptabilité aux changements de circonstances. Faire preuve de flexibilité, d'agilité, avoir une capacité d'adaptation, telles sont les compétences comportementales les plus attendues des candidats sur le marché de l'emploi. En effet, les organisations ont besoin, plus que jamais, de pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs capables de s'adapter, de composer avec des paramètres mouvants, d'acquérir de nouveaux savoir-faire, selon les exigences des situations rencontrées. Penser pouvoir figer l'environnement de travail est une utopie, au contraire, savoir s'adapter et réagir est une preuve de performance.
- Atteinte des résultats, amélioration de l'efficacité.
- Ajustement des objectifs. Si « *savoir, c'est pouvoir* », le fait de disposer d'informations fiables, tout au long du projet, et ce grâce à un suivi efficace, c'est assurément pouvoir agir, ajuster, rectifier pour atteindre le but visé

III. Processus de suivi des objectifs

A. Processus de suivi des objectifs

Maintenons que nous avons explicité l'importance d'assurer un suivi des projets, et d'être en capacité d'apporter des ajustements, si besoin, voyons comment se déroule l'établissement des mesures et des indicateurs de suivi.

Il est en effet important de définir des mesures et des indicateurs appropriés pour suivre les objectifs. Alors, quelles sont les méthodes pour sélectionner des mesures pertinentes, déterminer des critères de réussite et établir des systèmes de suivis fiables ?

La fiabilité du suivi repose bien évidemment sur des mesures fidèles à la réalité du terrain ; en ce sens, les KPIs choisis doivent pouvoir refléter sincèrement la réalité. Déterminer les indicateurs de suivi de la performance, c'est tout d'abord s'interroger sur la nature de l'item à évaluer : est-il mesurable de façon objective, de par un indicateur chiffré ? Ou doit-on recourir à un indicateur qualitatif ? Est-ce possible d'opter pour un indicateur quantitatif ? Ou non ?

Une fois cette question posée, et la réponse identifiée, il convient de chercher ensuite le meilleur indicateur, celui capable de nous aiguiller sur les problèmes et les réussites.

Prenons un exemple : une entreprise souhaite améliorer la performance de ses commerciaux. Le CA est en baisse, mais la raison reste non clarifiée à jour. Elle a alors plusieurs pistes. N'explorer que l'indicateur du taux de transformation pourrait induire une erreur d'interprétation. En effet, un taux de transformation faible inciterait

certainement l'entreprise à revoir ses méthodes de vente et son closing. Or, le problème réside peut-être dans le faible nombre de clients rencontrés : la réponse serait alors de renforcer la prospection. Ou dans un panier moyen trop faible, ce qui conduirait l'entreprise à former ses commerciaux sur la vente additionnelle. L'on voit bien ici qu'une analyse tronquée ne permet pas une réponse optimale.

Se pose maintenant la question de la collecte et de l'analyse des données de suivi. Quelles sont les étapes de collecte et d'analyse des données de suivi ? L'on recense plusieurs modes de collecte des indicateurs, selon notamment la nature de ces derniers. Ainsi, pour les indicateurs quantitatifs (le nombre de clients, le nombre d'étapes du projet franchises, un pourcentage, un ratio, etc.), il est important de les regrouper dans un seul et même outil de suivi. Cela peut être une feuille de calcul partagée, laquelle est accessible à l'ensemble des parties prenantes qui peuvent la modifier et en prendre connaissance en temps réel. Cela peut être un tableau que le chef de projet alimente quotidiennement, ou de façon hebdomadaire, mensuelle ou autre, après avoir récupéré les données auprès de ses équipes. D'autres supports existent pour la collecte des données chiffrées, des plateformes collaboratives notamment. L'importance de collecter des données précises et fiables peut justifier l'investissement dans des outils de conduite de projet (certains d'entre eux étant d'ailleurs gratuits).


Quant aux indicateurs qualitatifs, ils peuvent être collectés de différentes façons : des enquêtes ou des sondages, des entretiens individuels ou collectifs, des observations, des questionnaires, des groupes de discussion, etc. Un animateur et/ou un rapporteur sera alors chargé de récolter ces informations subjectives. Une collecte sans biais permettra ensuite une interprétation optimale des données, et d'identifier les tendances du projet, et notamment les forces et les faiblesses des performances par rapport aux objectifs fixés.

Méthode

Comment procéder à l'évaluation des résultats et des progrès ? Une fois les indicateurs choisis, et la collecte des données réalisée, il convient de recourir aux techniques d'évaluation des résultats et des progrès, et ce par rapport aux objectifs initiaux.

L'on recense plusieurs méthodes pour évaluer les performances, mesurer l'écart entre les résultats attendus et réels, et identifier les facteurs qui contribuent aux réussites ou aux échecs. Retenons-en trois principales : l'analyse SWOT, l'analyse Fishbone et la méthode McKinsey 7S.

Le SWOT est une matrice permettant de réfléchir aux forces et faiblesses d'un projet, d'une stratégie (les paramètres internes, propres à ce projet, à cette stratégie). Ainsi qu'aux opportunités et menaces de l'environnement, au sens large (sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise). Elles se matérialise ainsi :

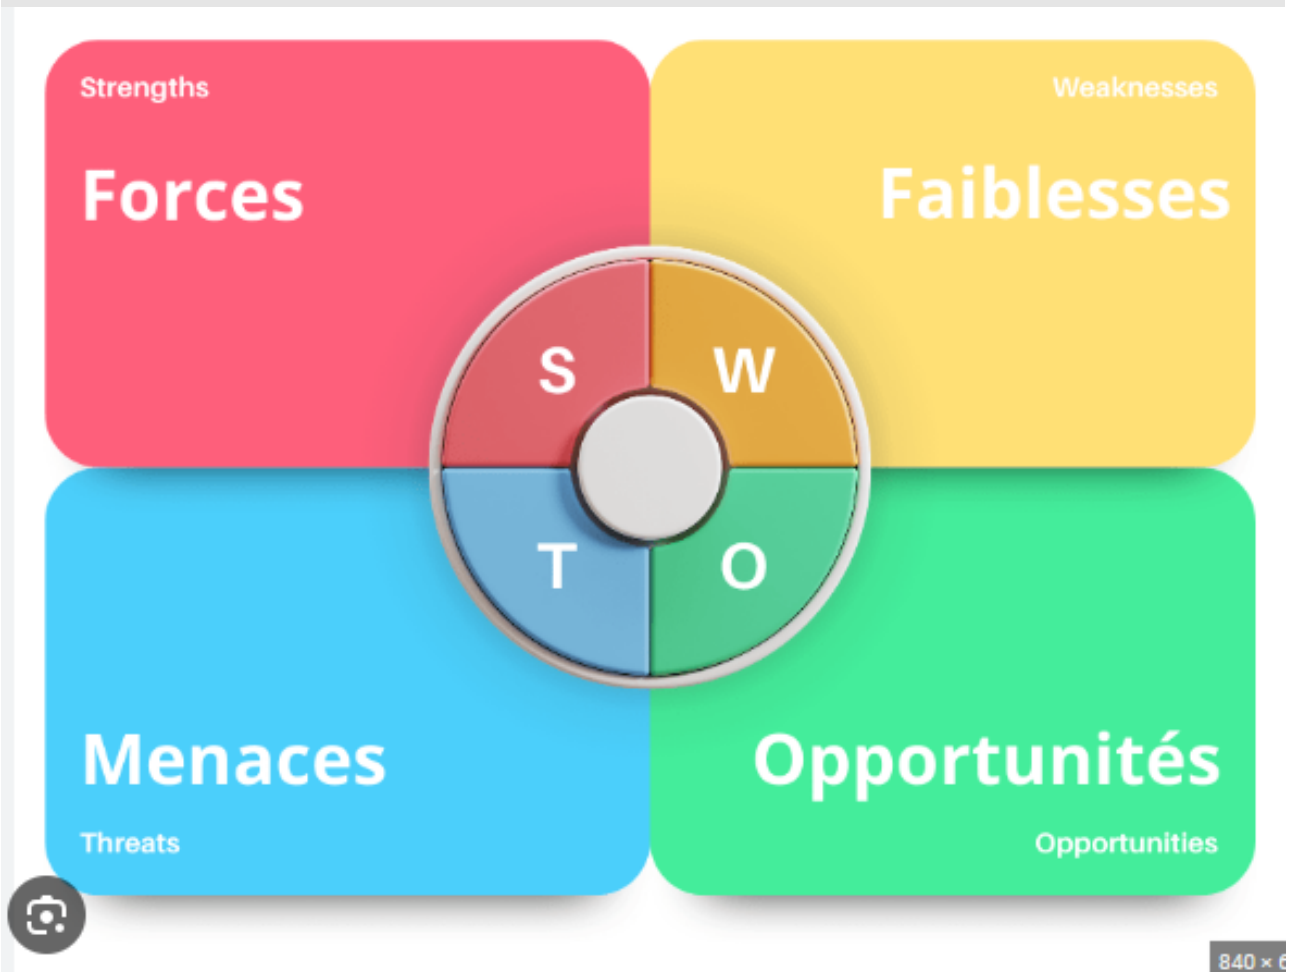

Source : Comment réaliser une analyse SWOT ? Créer une matrice SWOT¹

L'analyse Fishbone (ou « *arête de poisson* »), également appelée diagramme de cause à effet sert à identifier la cause profonde d'un problème. Le diagramme se concentre sur les 6 M :

- Machines
- Méthodes
- Matériaux
- Mère Nature (ou environnement externe)
- Main-d'oeuvre
- Mesures

Ces 6 items aident à établir la relation entre ces éléments clés et le problème central. Chacun de ces 6 M se décline en sous-branches pour ainsi séparer les causes racines des causes principales.

¹ <https://neplim.fr/formation-marketing/strategique/analyse-swot>




Source : Fishbone Diagram Explained | Reliable Plant¹

L'analyse McKinsey 7S pose le postulat de l'inter-dépendance de 7 éléments-clefs au sein de toute organisation. Ces 7 éléments sont divisés en éléments solides et souples ; les éléments solides sont tangibles et peuvent être contrôlés, tandis que les éléments souples sont tangibles et ne peuvent pas être contrôlés. On distingue :

- Éléments solides
 - Stratégie : les plans qui visent à obtenir un avantage concurrentiel
 - Structure : la structure organisationnelle, l'organisation, le business model
 - Systèmes : les processus commerciaux, les workflows
- Éléments souples
 - Valeurs partagées : l'ensemble des croyances que l'entreprise défend, son ADN, sa culture
 - Style : le style de leadership, le management
 - Personnel : les collaborateurs
 - Compétences : les compétences-clefs, les talents

¹ <https://www.reliableplant.com/fishbone-diagram-31877>

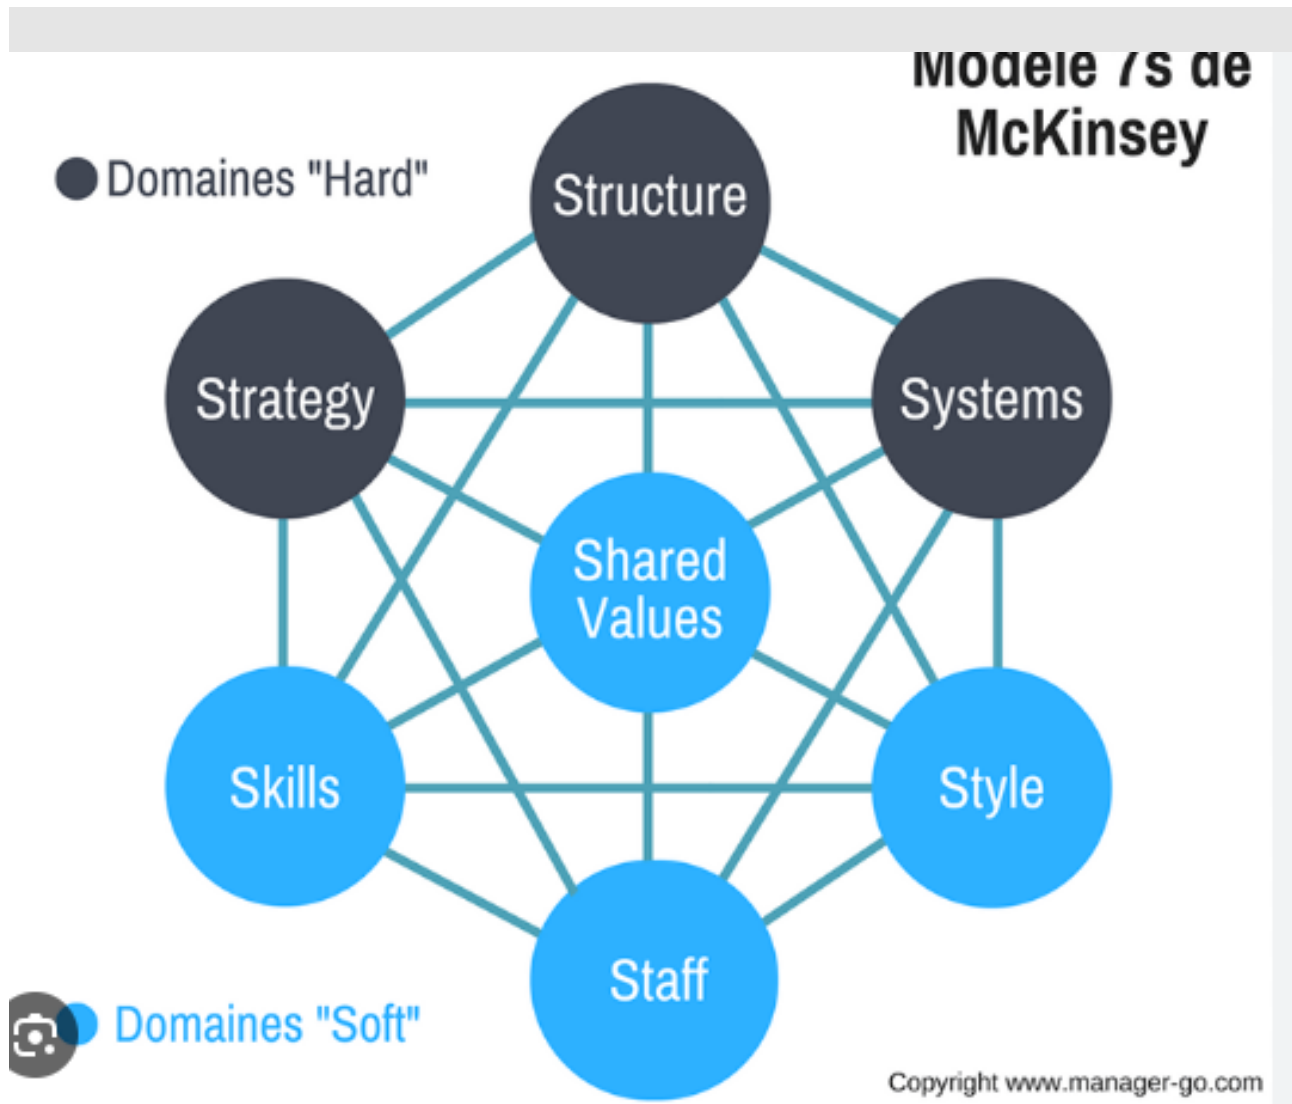

Source : Framework 7S de McKinsey : alignez votre entreprise¹

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

Pourquoi est-il important de suivre la réalisation d'un objectif ?

- ☐ Pour rendre le processus plus complexe
- ☐ Pour anticiper les éventuels ajustements nécessaires
- ☐ Pour ignorer les délais de réalisation
- ☐ Pour rendre les collaborateurs stressés.

Question 2

¹ <https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/cadre-7s-de-mckinsey>

Quelle est la première étape du processus de suivi des objectifs ?

- ☐ L'évaluation des résultats
- ☐ La définition des indicateurs et des critères de réussite
- ☐ La collecte des données
- ☐ La célébration des succès

Question 3

Pourquoi la fiabilité et la précision des données sont-elles importantes dans le suivi des objectifs ?

- ☐ Pour compliquer le processus
- ☐ Pour assurer des résultats faussés
- ☐ Pour garantir des résultats et une analyse précise
- ☐ Pour rendre le processus moins efficace

Question 4

Quelle est l'étape suivante après l'évaluation des résultats dans le processus de suivi des objectifs ?

- ☐ La collecte des données
- ☐ La définition des indicateurs
- ☐ La mesure des écarts entre les résultats attendus et réels
- ☐ La planification de la fête de réussite

Question 5

Pourquoi les écarts entre l'objectif et la réalisation peuvent-ils être une opportunité d'optimisation des relations internes ou externes ?

- ☐ Pour ignorer les opportunités d'optimisation
- ☐ Pour rester statique dans l'organisation
- ☐ Pour réfléchir à l'organisation inter ou intra-service et optimiser les relations
- ☐ Pour blâmer les collaborateurs

IV. Processus d'ajustement des objectifs

A. Processus d'ajustement des objectifs

Nous avons explicité plusieurs méthodes afin d'identifier les écarts entre les résultats réels et les objectifs fixés. Il est en effet important de réaliser une détection précoce de ces écarts afin de pouvoir y remédier rapidement et efficacement. De cette façon, les éventuels problèmes rencontrés ont la possibilité d'être traités rapidement, et cela présente un certain nombre d'avantages.

Tout d'abord, une intervention rapide prend en charge les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus graves. Cela peut éviter des conséquences négatives importantes. Ensuite, en identifiant rapidement les problèmes, il est possible d'agir sur l'allocation des ressources : la répartition des ressources matérielles, financières et humaines sera en effet à revoir pour apporter une solution au problème spécifique. En corrigeant rapidement les écarts, l'on peut également anticiper des retards dans la réalisation des objectifs. Cela est particulièrement important dans le cas de projets ayant des délais courts. Cela renforce par ailleurs la motivation des collaborateurs, dans le sens où le management donne et maintient un cap, et ne laisse pas les problèmes s'accumuler dangereusement, et grignoter

leur engagement. L'amélioration continue s'en trouve, elle aussi, renforcée puisque les domaines qui nécessitent des ajustements, ou de revoir la stratégie, ont pu être identifiés. Et donc traités. Enfin, la détection précoce des problèmes contribue à une meilleure gestion des risques en permettant de réagir rapidement aux menaces potentielles.

Intervenir sur les problèmes susceptibles de survenir tout au long de la vie d'un projet, cela fait donc partie des facteurs-clefs de succès de tout projet. Faire preuve d'anticipation des risques, réajuster les objectifs, modifier l'allocation des ressources, etc. Cela est possible à la condition de réussir l'analyse des causes et d'identifier les facteurs influents sur les écarts et les problèmes.

Il est possible de recourir aux techniques d'analyse des causes racines. Evidemment, lorsqu'un problème apparaît, plusieurs raisons peuvent l'expliquer : l'on parle alors d'un problème multi-factoriel. Or, il n'est pas toujours raisonnable d'agir sur l'ensemble de ces facteurs afin de solutionner le dit problème : cela risquerait d'épuiser les ressources disponibles. L'on recherche, stratégiquement, la ou les cause(s) racine(s), en s'aidant notamment de l'arbre des causes ou du diagramme des relations. Cette réflexion se mène collectivement avec les membres de l'équipe projet, dans le cadre d'un groupe de travail. Une fois la cause racine identifiée, il est alors possible d'apporter une réponse ciblée au problème, et de ne pas s'éparpiller dans les solutions. Cette réflexion est animée par l'un des membres du groupe, et s'en trouve facilitée par la méthode des « 5 Pourquoi », méthode utilisée notamment dans le domaine de la qualité. Elle permet, à chaque étape, ou à chaque « pourquoi » d'approfondir le raisonnement, jusqu'à trouver le dénominateur commun.

Les 5 Pourquoi

Pourquoi le tapis convoyeur s'est-il arrêté ?

Parce que le capteur a détecté une surcharge

Pourquoi le capteur a-t-il détecté une surcharge ?

Parce qu'il est mal étalonné.

Pourquoi est-il mal étalonné ?

Parce que l'on n'a pas pris le temps de le régler.

Pourquoi n'a-t-on pas pris le temps de le régler ?

Parce que l'on manque de personnel.

Pourquoi manque-t-on de personnel ?


Parce que le budget maintenance a été revu à la baisse.



www.piloter.org

Source : Les 5 Pourquoi¹

¹ <https://www.piloter.org/qualite/cinq-pourquoi.htm>

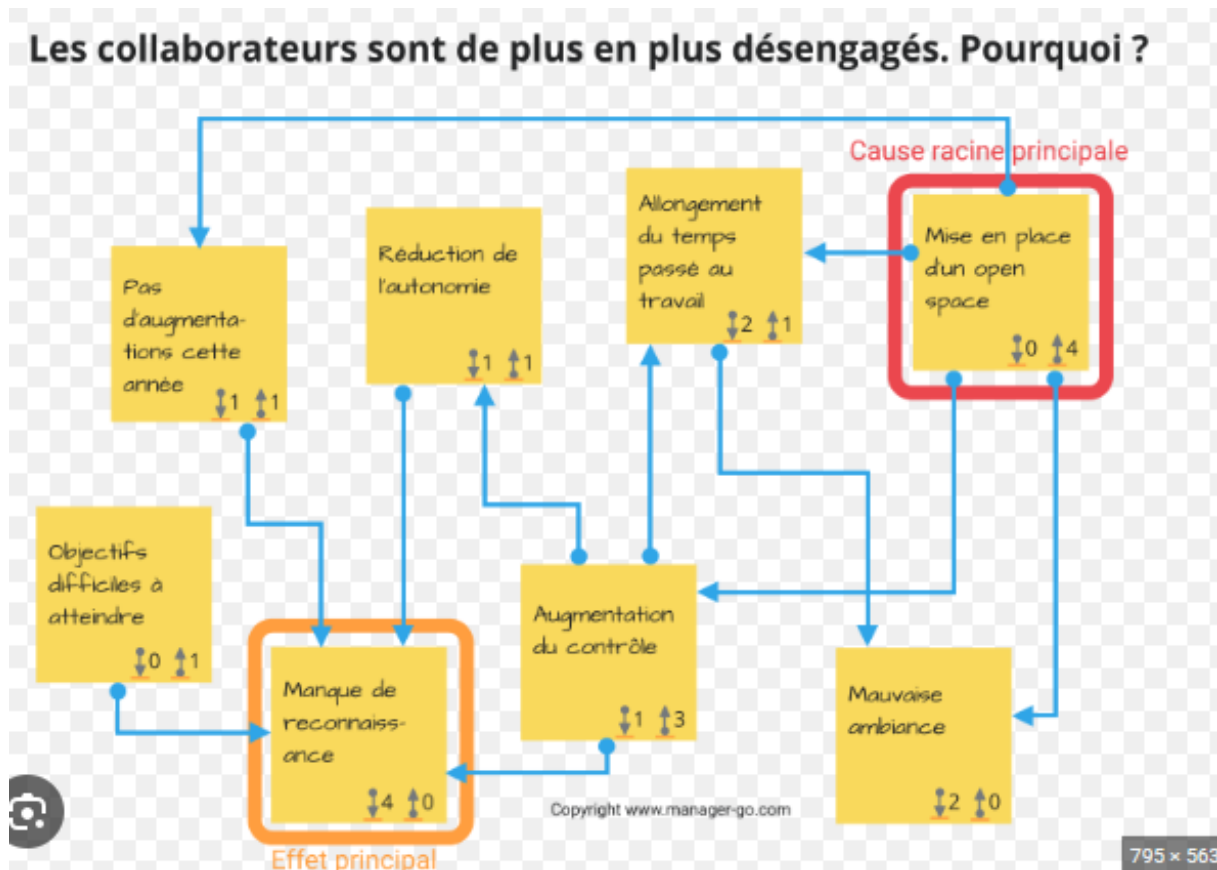

Source : Diagramme des relations : détecter les causes racines d'un problème¹

Par ailleurs, l'identification des facteurs de succès ou d'échec est possible en s'interrogeant sur les paramètres qui feraient que le projet soit un succès, ou au contraire, un échec. Quelle est la condition nécessaire à la bonne réalisation du projet ? Ou, quel paramètre compromettrait le bon déroulement du projet ? Ces questions permettent d'obtenir les FCS et, par extension, d'évaluer les risques associés à l'atteinte des objectifs.

Lorsque les causes racines sont identifiées, il est plus facile d'entreprendre les actions correctives et les ajustements nécessaires pour rectifier les écarts et traiter les problèmes. Il est également plus aisé de convaincre les diverses parties prenantes engagées dans le projet de changer de cap, dans la mesure où un véritable travail de réflexion a été mené en amont. Cela légitime les efforts demandés, qu'ils soient matériels, financiers ou humains. Concevoir et piloter un plan d'actions correctives implique de définir des mesures spécifiques, de réajuster les objectifs si nécessaire, et de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les performances.

Une action corrective, contrairement à une action pro-active, a cette particularité de traiter le problème de manière réactive, a posteriori. Dans une logique d'amélioration continue des pratiques au sein de l'organisation, il s'agira de se demander si ce problème aurait pu être anticipé en amont.

Pour construire un plan d'actions correctives, l'on peut recourir à la méthode CQQCOQP qui permet de poser les questions du Comment ? Quoi ? Qui ? Combien ? Où ? Quand ? et Pourquoi ? En répondant à l'ensemble de ces questions, l'on s'assure d'avoir traité le problème de manière exhaustive et de prendre en considération un certain nombre de paramètres.

Ce plan se déploie et se pilote comme le plan du projet initial. S'il concerne l'entièreté du projet, il remplace le plan initial. S'il ne concerne qu'une partie du projet, alors le manager ou le chef de projet aura à piloter conjointement les deux. Il comporte lui aussi des indicateurs de performance, concernant notamment les délais de réalisation, les coûts et la qualité (le résultat attendu).

¹ <https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/dossiers-methodes/diagramme-des-relations>

V. L'essentiel

Le suivi et l'ajustement des objectifs sont donc essentiels à la continuité d'un projet, à son bon déroulement et parfois même à sa survie. Sous la responsabilité du chef de projet, les différentes étapes sont validées avec, si tout se passe parfaitement, une capitalisation sur les succès et les bonnes pratiques. Si tel n'est pas le cas, une remise en question constructive des forces et des faiblesses du projet. Avec, à la clef, la proposition d'un plan d'action corrective pour assurer la performance, et l'engagement des équipes.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Voici un exemple de management au sein de deux équipes commerciales, dans deux entreprises différentes.

Logi'plus est une start'up sur le marché des logiciels SIRH, elle est actuellement en pleine croissance. Créée il y a 1 an, elle a lancé son logiciel phare. Son objectif commercial est de réaliser 100 ventes dans les 6 prochains mois.

Software'Rh, évoluant sur le même marché, a pour objectif de consolider ses parts de marché et d'augmenter ses ventes (de l'ensemble de ses logiciels), afin d'atteindre un CA 2024 de 10 M€.

Le suivi des objectifs laisse voir quelques difficultés pour ces 2 entreprises.

L'équipe commerciale de la start'up a réalisé 30 ventes de licences de logiciel sur les 3 premiers mois, Une analyse des difficultés a mis en évidence le fait que la conversion des leads en clients payants est plus lente que prévu en raison de la concurrence accrue dans le secteur.

Chez Software'Rh, l'équipe commerciale a suivi mensuellement ses ventes et a constaté qu'elles étaient en ligne avec les objectifs trimestriels. Cependant, elle a identifié un défi majeur : un produit concurrent menace ses parts de marché.

Question

[solution n°2 p.14]

Dans quelle mesure les entreprises Logi'Plus et Software'Rh peuvent-elles ajuster leurs objectifs ?

Solutions des exercices

Exercice p. 8 Solution n°1**Question 1**

Pourquoi est-il important de suivre la réalisation d'un objectif ?

- ☐ Pour rendre le processus plus complexe
- ☒ Pour anticiper les éventuels ajustements nécessaires
- ☐ Pour ignorer les délais de réalisation
- ☐ Pour rendre les collaborateurs stressés.

 Il est crucial de suivre la réalisation des objectifs pour anticiper d'éventuels ajustements nécessaires en raison de changements de circonstances. Le suivi permet d'identifier les écarts entre les prévisions et la réalité, facilitant ainsi la prise de décisions informées.

Question 2

Quelle est la première étape du processus de suivi des objectifs ?

- ☐ L'évaluation des résultats
- ☒ La définition des indicateurs et des critères de réussite
- ☐ La collecte des données
- ☐ La célébration des succès

 La première étape du processus de suivi des objectifs est la définition des indicateurs et des critères de réussite. Cela établit la base pour suivre la progression vers l'objectif.

Question 3

Pourquoi la fiabilité et la précision des données sont-elles importantes dans le suivi des objectifs ?

- ☐ Pour compliquer le processus
- ☐ Pour assurer des résultats faussés
- ☒ Pour garantir des résultats et une analyse précise
- ☐ Pour rendre le processus moins efficace

 La fiabilité et la précision des données sont cruciales dans le suivi des objectifs car des données précises et fiables garantissent des résultats et une analyse précis, facilitant une prise de décision informée.

Question 4

Quelle est l'étape suivante après l'évaluation des résultats dans le processus de suivi des objectifs ?

- ☐ La collecte des données
- ☐ La définition des indicateurs
- ☒ La mesure des écarts entre les résultats attendus et réels
- ☐ La planification de la fête de réussite

 Après l'évaluation des résultats, l'étape suivante est la mesure des écarts entre les résultats attendus et réels, ce qui permet une analyse approfondie des performances.

Question 5

Pourquoi les écarts entre l'objectif et la réalisation peuvent-ils être une opportunité d'optimisation des relations internes ou externes ?

- ☐ Pour ignorer les opportunités d'optimisation
- ☐ Pour rester statique dans l'organisation
- ☒ Pour réfléchir à l'organisation inter ou intra-service et optimiser les relations
- ☐ Pour blâmer les collaborateurs
-  Les écarts entre l'objectif et la réalisation offrent souvent l'occasion de réfléchir à l'organisation inter ou intra-service et aux opportunités d'optimisation des relations internes ou externes, favorisant ainsi l'amélioration continue.

p. 12 Solution n°2

Logi'Plus a réalisé 30 ventes en 3 mois, ce qui représente 30 % de son objectif de six mois. La direction commerciale peut ici décider d'ajuster les objectifs en conséquence et ainsi réduire l'objectif à 80 ventes. Ce nouvel objectif commercial est accompagné d'une nouvelle stratégie marketing pour accélérer la conversion des leads en clients. Quant à Software'Rh, la direction commerciale peut décider, en lien avec la DG, d'ajuster la stratégie de tarification, afin d'être en cohérence avec le marché actuel et l'émergence de start'ups compétitives. L'entreprise décide par ailleurs de capitaliser sur ses forces : un service client structuré et compétent.
