

La gestion de projet

Table des matières

I. Phase de cadrage	3
A. Décomposer les tâches du projet	3
B. Planifier les tâches à effectuer	4
C. Répartir les tâches selon les compétences de l'équipe	5
D. Mettre en place des KPI adaptés aux objectifs.....	6
II. Exercice : Quiz	7
III. Pilotage du projet de communication	8
A. Management de projet en interne	8
B. Communication avec le client (l'annonceur)	9
IV. Exercice : Quiz	9
V. Feedback et actions correctives	10
A. Faire le bilan sur le projet	10
B. Mettre en place des actions post-campagne	11
VI. Exercice : Quiz	11
VII. Essentiel	12
VIII. Auto-évaluation	13
A. Exercice :	13
B. Test	14
Solutions des exercices	15

I. Phase de cadrage

Contexte

Une fois le projet défini et formalisé par le plan de communication, il est temps de préparer l'exécution opérationnelle, avec la gestion associée : qui fait quoi, quand, avec quels moyens ?

Le management de projet est l'une des fonctions principales du chef de projet, dont la mission est de s'assurer du bon déroulement du projet de communication, de sa conception à sa réalisation complète. Aussi, tout au long de la gestion opérationnelle, le chef de projet devra tout mettre en œuvre pour satisfaire l'annonceur, que ce dernier soit son patron ou son client (dans le cas d'une agence).

Avant de démarrer l'exécution du plan de communication, il est important de bien cadrer le projet : qui va faire quoi, à quel moment ? Quels sont les objectifs de chaque membre de l'équipe ?


Le/La chef de projet a notamment pour responsabilité de découper les tâches et d'assurer leur répartition de manière cohérente, équitable et efficiente.

A. Décomposer les tâches du projet

Pour répartir les tâches de manière efficace, il convient d'abord de décomposer l'ensemble des travaux nécessaires sur le projet, à l'aide d'un **organigramme des tâches**. Cet outil, qui se présente sous forme d'arborescence, permet de détailler chacune des tâches en sous-tâches ou livrables attendus. C'est une représentation très concrète, qui donne au chef de projet une vision plus précise du temps et du budget à prévoir pour chacun des travaux à réaliser.


Méthode

Modélisation d'un organigramme des tâches

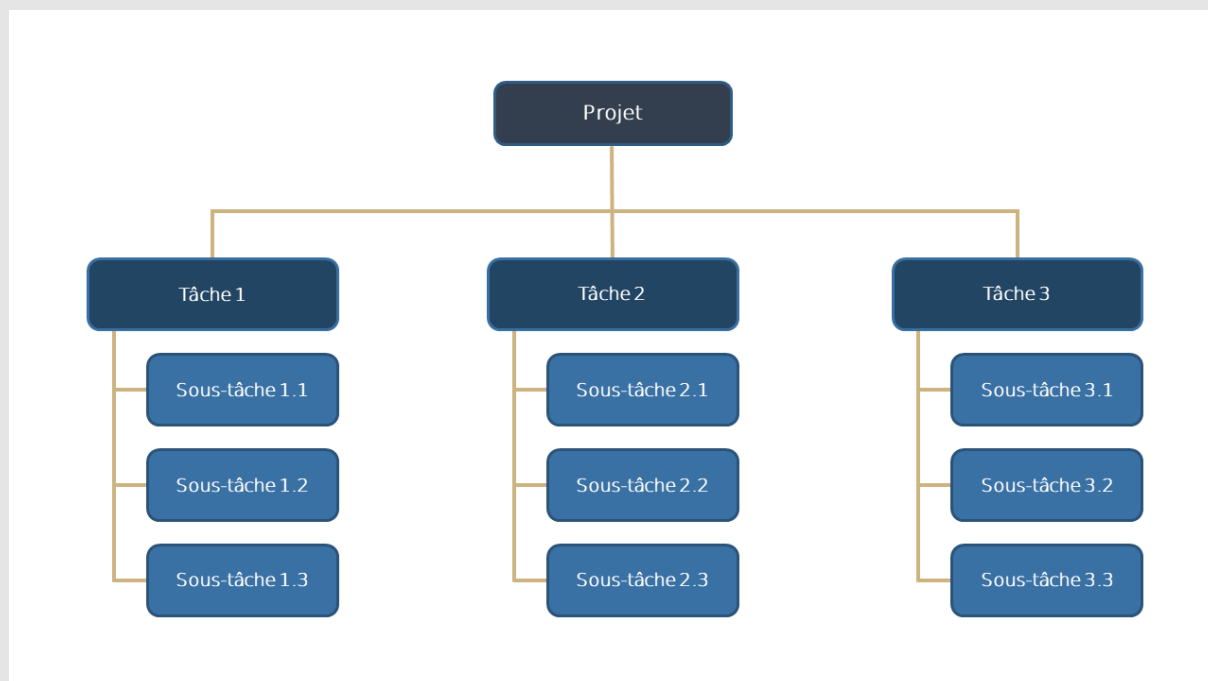

Exemple

Arthur, chef de projet junior dans une agence de communication, réalise pour un client l'organigramme des tâches pour le lancement d'une nouvelle gamme de yaourts bio.

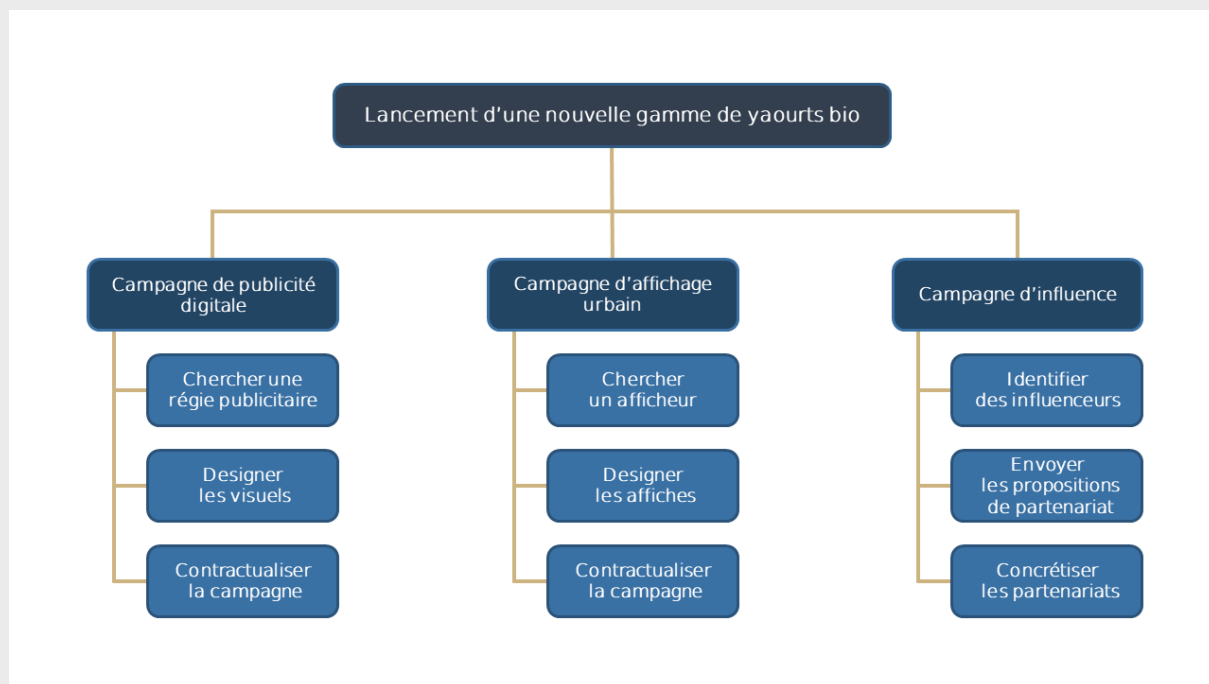

B. Planifier les tâches à effectuer

Le chef de projet planifie les tâches qu'il a identifiées avec son équipe, de manière à avoir un déroulé cohérent dans l'opérationnel. Pour cela, il établit un **rétroplanning** : un des outils les plus utilisés est le **diagramme de Gantt**, sur lequel les tâches sont placées les unes à la suite des autres, en tenant compte des éventuels retards de calendrier. Grâce à l'utilisation de ce diagramme, le chef de projet peut facilement visualiser l'enchaînement des tâches, ainsi que l'impact des éventuels retards.

Exemple

Rétroplanning simplifié pour le projet de lancement de la gamme de yaourts bio :

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
Campagne de publicité en ligne				
• Chercher une régie				
• Designer les visuels				
• Contractualiser la campagne				
• Lancement de la campagne				
Campagne d'affichage urbain				
• Chercher un afficheur				
• Designer les affiches				
• Contractualiser la campagne				
• Lancement de la campagne				
Campagne d'influence				
• Identifier les influenceurs				
• Envoyer les propositions				
• Contractualiser				
• Lancement de la campagne				

Complément

Pour vous exercer, téléchargez¹ gratuitement le logiciel Gantt Project et utilisez-le pour reproduire le rétroplanning ci-dessus.

C. Répartir les tâches selon les compétences de l'équipe

Après avoir décomposé le projet, le chef de projet répartit les rôles dans son équipe, en fonction des compétences et des aptitudes de chacun, et en tenant compte de l'expérience de chaque membre.

Ainsi, chaque tâche est assignée à un collaborateur ou un pôle. Cette attribution des tâches peut être modélisée dans une **matrice de responsabilité**. Grâce à cet outil, chaque membre de l'équipe sait précisément ce qu'il doit faire, mais aussi ce dont ses collègues sont responsables.

¹ <https://www.ganttproject.biz/download/free>

Exemple

	Chef de projet Arthur	Graphisme Léo	Web Anna	Influence marketing Clémence
Création d'un site vitrine	Consulté Validation	Acteur	Responsable	
Campagne de publicité digitale	Consulté Validation	Acteur	Responsable	
Campagne d'affichage	Responsable	Acteur		
Campagne d'influence	Consulté Validation	Acteur	Acteur	Responsable

Remarque

Selon les compétences présentes en interne et le niveau d'expertise requis pour certaines tâches, il est souvent intéressant pour une entreprise ou une agence d'avoir recours à des freelances. En effet, le principal intérêt de recourir à des indépendants est d'avoir accès à une compétence nécessaire au projet sans pour autant créer de charges salariales sur le long terme pour l'entreprise.

Exemple

Un studio photo culinaire qui signerait un gros contrat avec une entreprise industrielle pour la création de recettes dans le cadre d'un plan de communication aurait plus intérêt à faire appel à une personne en freelance pour la rédaction d'une série de recettes accompagnant ses photos, qu'à embaucher une personne avec un contrat salarié classique.

Remarque

L'organigramme des tâches et la matrice de responsabilité fonctionnent très bien quand ils sont utilisés ensemble de manière itérative par le chef de projet. En effet, les utiliser en complémentarité en optimisant tour à tour l'un et l'autre permet de dessiner les contours de la gestion du projet de la manière la plus réaliste possible, avant même de fixer la date de la réunion de lancement du projet.

D. Mettre en place des KPI adaptés aux objectifs

Pour mener un projet à bien, il est du ressort du chef de projet de suivre scrupuleusement le déroulement et les résultats de son équipe à chaque étape. À ce sujet, il est d'usage de fixer des **indicateurs de performance, ou « KPI » en anglais (Key Performance Indicators)**.

Idéalement, un KPI doit être assigné à chaque tâche et à une personne précise. Le chef de projet consigne tous les indicateurs définis et suit leur progression dans un **tableau de bord**.

Exemple

Pour la tâche « *campagne d'influence* », le travail de Clémence pourra être suivi selon les KPI suivants :

- Nombre de partenariats blogueurs signés, avec un objectif de 5 par semaine.
- Nombre de *posts* Instagram mentionnant la marque de l'annonceur : 15 par semaine.
- Nombre de *stories* Instagram mentionnant la marque de l'annonceur : 25 par semaine.
- Nombre d'articles de blogs sur les nouveaux yaourts bio : 5 par mois.

Et voici la partie du tableau de bord d'Arthur concernant le travail de Clémence sur un mois :

KPI	Objectif mensuel	Réalisé semaine 1	Réalisé semaine 2	Réalisé semaine 3	Réalisé semaine 4	Total réalisé	Taux de réalisation
Nombre de partenariats blogueurs signés	20	5	4	6	5	20	100 %
Nombre de <i>posts</i> Instagram	60	16	20	12	15	63	105 %
Nombre de <i>stories</i> Instagram	100	21	22	19	30	92	92 %
Nombre d'articles de blogs	5	1	1	0	3	5	100 %

Ainsi, le chef de projet encadre ses collaborateurs et suit la progression de leurs tâches à mesure de l'avancement de la partie opérationnelle. Si besoin, il peut procéder à un redécoupage ou à une réattribution des tâches. Il a aussi un rôle d'écoute et de soutien auprès de ses collaborateurs en cas de difficultés sur certains travaux. On peut dire que le cœur de la mission du chef de projet est de fédérer son équipe autour de la **réalisation des objectifs** du projet.

Exercice : Quiz

Question 1

L'organigramme des tâches sert à :

- ☐ Décomposer le projet en tâches et sous-tâches
- ☐ Répartir les tâches selon l'organigramme de l'entreprise
- ☐ Assigner les tâches aux collaborateurs

Question 2

Un KPI, c'est :

- ☐ Un indicateur clé de performance
- ☐ Un facteur clé de succès
- ☐ Un objectif réalisé

Question 3

Le management de projet constitue le cœur de métier d'un(e) chef de projet.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Pour répartir les tâches au sein de l'équipe projet, l'outil le plus adapté est :

- ☐ L'organigramme des tâches
- ☐ La matrice de responsabilité
- ☐ Le SWOT

Question 5

Dans une équipe projet, chacun doit se concentrer sur sa partie sans perdre de temps à se préoccuper du travail des autres.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

II. Pilotage du projet de communication

Le chef de projet a pour mission de s'assurer de la bonne mise en œuvre des actions définies par le plan de communication, à chaque stade d'avancement. Pour cela, il doit à la fois être un bon manager pour son équipe, et savoir communiquer avec l'annonceur, qui est soit son patron soit son client, afin de le rassurer, notamment sur la tenue des objectifs fixés.

A. Management de projet en interne

Dès le lancement du projet, le déroulement de celui-ci doit être suivi de près. Le chef de projet organise des **réunions régulières**, toutes les semaines au minimum, au cours desquelles il recueille les *feedbacks* de ses collaborateurs, redirige l'équipe en cas de difficultés, et pilote si besoin la réadaptation de certaines parties du projet au fil de l'eau.

En management de projet, il est essentiel de maintenir une bonne communication interne, notamment à travers un dialogue quotidien avec chacun des membres de l'équipe : la machine à café est d'ailleurs le lieu idéal pour cela !

Aussi, afin de structurer au mieux l'équipe et d'optimiser la gestion du projet, l'utilisation d'outils dédiés est plus que recommandée :

- Pour structurer et suivre l'avancement de chaque partie du projet, beaucoup d'entreprises et d'agences utilisent la **méthode Kanban**, notamment à travers l'outil **Trello**.
- Pour dialoguer en temps réel ou au contraire gérer son temps et ne répondre aux sollicitations de ses collègues qu'à certaines plages horaires de la journée, **Slack** est un excellent outil de messagerie interne. Les conversations y sont organisées par groupes de travail et par thèmes de discussion.

Méthode

La méthode Kanban est très utilisée par les développeurs informatiques : elle permet de classer les tâches selon leur état d'avancement, et donc d'avoir un aperçu rapide de l'état du projet.

Le Kanban, repris par l'outil en ligne Trello, se modélise généralement de la manière suivante (les tâches se déplacent de manière horizontale sur la matrice) :

En réflexion	À faire	En cours	Bloqué	En attente de validation	Terminé
					Tâche 1
				Tâche 2	
		Tâche 3			
Tâche 4					
	Tâche 5				

B. Communication avec le client (l'annonceur)

Le commanditaire a mis en jeu un certain budget dans le projet, ainsi qu'une partie de ses objectifs commerciaux et de l'image de sa marque. En conséquence, il a besoin d'être informé très régulièrement de l'avancement de son projet de communication, avec des chiffres clairement lisibles. Une partie du travail du chef de projet consiste donc à rassurer l'annonceur, et à lui prouver l'efficacité du plan de communication sur le terrain.

Pour cela, le chef de projet s'engage en début de projet à faire des **reportings** réguliers à l'annonceur, KPI et tableaux de bord à l'appui.

En cas de dysfonctionnement d'une partie du plan de communication, qui se caractériserait par des résultats insatisfaisants, le chef de projet doit identifier ce qui ne fonctionne pas et proposer des solutions d'ajustement à l'annonceur pour lequel il travaille.

Exemple

Si une campagne d'affichage a été envisagée de manière un peu trop ambitieuse, des résultats insatisfaisants peuvent provenir soit d'un objectif surévalué au départ, soit d'un budget insuffisant par rapport à l'objectif.

Dans ce cas, c'est au chef de projet de déterminer avec l'annonceur quelle solution adopter : soit abaisser légèrement l'objectif, soit augmenter le budget.

Exercice : Quiz

Question 1

L'outil Trello permet de :

- ☐ Faire facilement de beaux visuels pour la communication
- ☐ Organiser les tâches et suivre leur état d'avancement
- ☐ Planifier les projets des différents clients d'une agence

Question 2

Trello s'inspire de la méthode :

- ☐ SWOT
- ☐ 5W
- ☐ Kanban

Question 3

L'outil Slack est l'équivalent :

- ☐ D'une messagerie interne d'entreprise
- ☐ D'un outil d'*emailing*
- ☐ D'un navigateur web

Question 4

Tout au long du déroulement du projet, le chef de projet est totalement indépendant et n'a pas besoin de recontacter l'annonceur avant la facturation.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Si, en cours d'exécution du plan de communication, le chef de projet s'aperçoit que certaines actions n'ont pas l'effet espéré, il doit :

- ☐ Mettre rapidement en place les actions correctives qui s'imposent
- ☐ Ne rien changer et suivre le plan de communication à la lettre
- ☐ Gérer le problème et ne surtout pas en parler à l'annonceur

III. Feedback et actions correctives

À l'issue du projet de communication, il faudra faire le point sur les résultats, de recueillir le *feedback* des différents acteurs, et si besoin de mettre en place les actions correctives nécessaires.

A. Faire le bilan sur le projet

Les premiers indicateurs du succès du projet sont donnés par le tableau de bord général : l'atteinte des objectifs se mesure d'abord grâce aux taux de réussite sur les différents KPI, qui donnent une bonne idée des résultats quantitatifs par rapport aux objectifs fixés.

La mesure du retour sur investissement (en anglais, ROI – *Return On Invest*) se fait à plus moyen terme en plusieurs phases : à la fin du projet de communication, puis quelques semaines après. Le ROI d'une opération de communication se calcule de la manière suivante :

$$\text{ROI} = (\text{Chiffre d'affaires généré (ou perdu)} - \text{Coûts de communication}) / \text{Coûts de communication}$$

Exemple Calcul du ROI

Si la campagne de communication a coûté 5000 € et que le chiffre d'affaires généré est de 20 000 €, alors le retour sur investissement est de $(20\,000 - 5\,000) / 5\,000 = 3$, soit 300 %.

On peut dire que c'est une campagne réussie !

Si l'objectif du plan de communication était essentiellement lié à l'image de marque, on se fiera à des indicateurs de nature plus qualitative, comme la mesure du taux de notoriété spontanée, ou encore la mesure de la perception de la marque auprès de la cible. Cette dernière est vraiment qualitative, car elle est très difficile à chiffrer, elle correspond plutôt à un *feedback* d'ordre émotionnel.

Remarque

Sur un projet de communication, il est important de bien faire la différence entre les notions d'efficacité et d'efficience :

- L'efficacité mesure les résultats par rapport aux objectifs fixés,
- L'efficience, elle, mesure les résultats par rapport aux moyens mis en œuvre pour atteindre l'objectif.

Le bilan du projet doit aussi être fait en interne, afin de recueillir les impressions de l'équipe et d'optimiser le management sur les prochains projets : on appelle cela le « **debrief** ».

En entreprise comme dans la vie, apprendre de ses erreurs, c'est la meilleure façon de progresser !

B. Mettre en place des actions post-campagne

Si les résultats du plan de communication s'avèrent insuffisants sur le plan quantitatif ou décevants sur le plan qualitatif (déviation de la cible visée, biais d'interprétation identifié), il faudra absolument réfléchir à la mise en place d'actions correctives afin de se rapprocher des objectifs fixés par le brief initial. Dans ce cas, un budget supplémentaire sera peut-être nécessaire de la part de l'annonceur.

De manière plus générale, le chef de projet doit toujours garder à l'esprit qu'une stratégie de communication s'envisage dans la durée, et que chaque plan de communication n'en est qu'une partie. Ainsi, même si les résultats des actions mises en œuvre sont très positifs, il faut toujours prévoir des actions de rappel, sur quelques semaines voire quelques mois après la fin du plan de communication.

Exemple

Dans le cas des yaourts bio cités plus tôt dans le cours, si la campagne d'influence donne des résultats satisfaisants, il sera sûrement bon de continuer à faire des partenariats blogueurs sur la durée, qui agiront sur la cible visée comme des piqures de rappel.

Exercice : Quiz

Question 1

Le retour sur investissement se calcule dès le début de la campagne de communication.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

À l'issue du projet de communication, le chef de projet peut « *classer le dossier* » et passer à autre chose.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

L'efficience d'une action ou d'un plan de communication, c'est :

- ☐ Le rapport « *résultats / moyens mis en place* »
- ☐ Le rapport « *résultats / objectifs fixés en amont* »

Question 4

Si une action de communication a coûté 1000 €, et généré 1500 € de chiffre d'affaires, le ROI est de :

- ☐ 5 %
- ☐ 50 %
- ☐ 500 %

Question 5

À la fin du projet de communication, le chef de projet organise une réunion pour recueillir les *feedbacks* de ses collaborateurs sur le déroulement du projet. Cette phase s'appelle :

- ☐ La phase finale
- ☐ Le brief
- ☐ Le debrief

IV. Essentiel

Fondamental

La gestion d'un projet de communication s'envisage de manière globale et transversale, aussi bien dans le temps que dans le management d'équipe.

En effet, il est très important de bien cadrer le projet en amont, en découpant les tâches et en les répartissant de manière logique au sein de l'équipe projet. Ensuite, pendant la phase opérationnelle, le chef de projet va assurer la coordination de l'équipe sur les différents travaux, tout en ayant une fonction support auprès de ses collaborateurs. Il doit également faire des *reportings* réguliers à l'annonceur, qu'il s'agisse de son supérieur ou de son client. Enfin, à l'issue de cette phase de pilotage, le chef de projet fait le bilan de l'opération, et met en place les actions post-campagne qu'il estime nécessaires : il peut s'agir d'actions de rappel comme de mesures correctives.



V. Auto-évaluation

A. Exercice :

Aïcha est chef de projet de communication dans une entreprise d'événementiel. Elle est chargée de promouvoir une exposition photographique organisée à Montpellier sur 2 semaines, aidée de son collègue graphiste Julien et du pôle web de son entreprise.

Question 1

Vous êtes stagiaire dans l'équipe d'Aïcha. Réalisez un rétroplanning pour la communication sur l'exposition photo.

Tâches	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
Préparer les visuels de l'événement						
Relayer l'événement sur les réseaux sociaux						
Sponsoriser les publications réseaux sociaux						
Envoyer les invitations						
Rédiger le communiqué de presse						
Envoyer le communiqué de presse						
Préparer la soirée d'inauguration						
Accueillir les invités pour l'inauguration						

Question 2

Afin de répartir aux mieux les tâches, proposez une matrice de responsabilité pour la gestion de ce projet.

Tâches	Aïcha	Julien	Équipe web
Préparer les visuels de l'événement			
Relayer l'événement sur les réseaux sociaux			
Sponsoriser les publications réseaux sociaux			
Envoyer les invitations			
Rédiger le communiqué de presse			

Tâches	Aïcha	Julien	Équipe web
Envoyer le communiqué de presse			
Préparer la soirée d'inauguration			
Accueillir les invités pour l'inauguration			

B. Test

Aïcha est chef de projet de communication dans une entreprise d'événementiel. Elle est chargée de promouvoir une exposition photographique organisée à Montpellier sur 2 semaines, aidée de son collègue graphiste Julien et du pôle web de son entreprise.

Exercice : Quiz

Exercice

Dans quelle phase du projet de communication fait-on la répartition des tâches ?

- ☐ La phase de cadrage
- ☐ La phase de *feedback*
- ☐ La phase de pilotage

Question 2

Le rétroplanning permet de :

- ☐ Définir les objectifs de chaque tâche
- ☐ Suivre les KPI et l'atteinte des objectifs
- ☐ Planifier les tâches dans le temps

Question 3

La répartition des tâches par le chef de projet se fait en fonction :

- ☐ Du hasard
- ☐ Des compétences et de l'expérience de chaque membre de l'équipe
- ☐ Des affinités au sein de l'équipe

Question 4

S'il manque une compétence dans l'équipe pour un projet particulier, la meilleure solution pour le chef de projet est de :

- ☐ Faire appel à une ou plusieurs personne(s) compétente(s) en freelance
- ☐ Demander de l'aide à un(e) ami(e)
- ☐ Demander à un des membres de l'équipe de se former sur la compétence en question

Question 5

Comment appelle-t-on le fait de faire des comptes rendus réguliers à son supérieur ou à son client par rapport à un projet en cours ?

- ☐ Le *feedback*
- ☐ Le *reporting*
- ☐ Le retour client

Solutions des exercices

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

L'organigramme des tâches sert à :

- ☒ Décomposer le projet en tâches et sous-tâches
- ☐ Répartir les tâches selon l'organigramme de l'entreprise
- ☐ Assigner les tâches aux collaborateurs
-  L'organigramme des tâches permet de décomposer le projet en tâches et sous-tâches, modélisées sous forme d'arborescence.

Question 2

Un KPI, c'est :

- ☒ Un indicateur clé de performance
- ☐ Un facteur clé de succès
- ☐ Un objectif réalisé
-  Un KPI, qui signifie en anglais « *Key Performance Indicator* », est un indicateur de performance, fixé sur une variable à surveiller : un chiffre d'affaires, un nombre de *followers* dans une communauté, un taux d'évolution, etc. Il sert notamment à chiffrer les objectifs et à en suivre l'avancement.

Question 3

Le management de projet constitue le cœur de métier d'un(e) chef de projet.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  En effet, le management de projet, qui comprend la gestion opérationnelle du projet, la communication interne au sein de l'équipe et la communication auprès du client, constitue le cœur du métier de chef de projet.

Question 4

Pour répartir les tâches au sein de l'équipe projet, l'outil le plus adapté est :

- ☐ L'organigramme des tâches
- ☒ La matrice de responsabilité
- ☐ Le SWOT
-  La matrice de responsabilité permet de déterminer, sous forme de tableau, quels sont les acteurs sur chaque tâche, qui en est responsable et qui a le pouvoir de validation.

Question 5

Dans une équipe projet, chacun doit se concentrer sur sa partie sans perdre de temps à se préoccuper du travail des autres.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux
-  Dans une équipe projet en communication, chaque membre est dépendant des autres. Par exemple, les spécialistes web ont souvent besoin des graphistes pour avancer sur leurs tâches. C'est pourquoi l'équipe doit travailler en complémentarité et de manière rapprochée.

Exercice p. 9 Solution n°2

Question 1

L'outil Trello permet de :

- ☐ Faire facilement de beaux visuels pour la communication
- ☒ Organiser les tâches et suivre leur état d'avancement
- ☐ Planifier les projets des différents clients d'une agence
-  Trello permet de gérer les tâches d'un projet, et de les « ranger » facilement selon leur état d'avancement.

Question 2

Trello s'inspire de la méthode :

- ☐ SWOT
- ☐ 5W
- ☒ Kanban
-  En effet, l'outil Trello est inspiré de la méthode Kanban, qui permet de classer les tâches selon leur état d'avancement, et de les faire « avancer » de manière horizontale dans un tableau qui représente la situation du projet.

Question 3

L'outil Slack est l'équivalent :

- ☒ D'une messagerie interne d'entreprise
- ☐ D'un outil d'*emailing*
- ☐ D'un navigateur web
-  Slack est un système de messagerie interne d'entreprise, qui permet aux collaborateurs de discuter des projets en cours, et aussi de mieux gérer leur temps.

Question 4

Tout au long du déroulement du projet, le chef de projet est totalement indépendant et n'a pas besoin de recontacter l'annonceur avant la facturation.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux
-  Au contraire, il est très important que le chef de projet fasse des *reportings* réguliers à l'annonceur, pour l'informer et le rassurer sur l'avancement et les résultats du projet de communication.

Question 5

Si, en cours d'exécution du plan de communication, le chef de projet s'aperçoit que certaines actions n'ont pas l'effet espéré, il doit :

- ☒ Mettre rapidement en place les actions correctives qui s'imposent
- ☐ Ne rien changer et suivre le plan de communication à la lettre
- ☐ Gérer le problème et ne surtout pas en parler à l'annonceur

-  En cas de résultats décevants identifiés en cours de campagne, la meilleure chose à faire pour le chef de projet est d'analyser la situation avec son équipe, puis de mettre en place des actions correctives en accord avec l'annonceur (surtout si ce dernier doit rajouter du budget).

Exercice p. 11 Solution n°3

Question 1

Le retour sur investissement se calcule dès le début de la campagne de communication.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  Le retour sur investissement se calcule à l'issue de l'exécution du plan de communication, et dans les quelques semaines ou mois suivants. En effet, c'est un indicateur à court et moyen termes.

Question 2

À l'issue du projet de communication, le chef de projet peut « *classer le dossier* » et passer à autre chose.

- ☐ Vrai
☒ Faux

-  La communication d'une entreprise s'envisage sur la durée. Même quand un plan de communication est « *terminé* », il est important de prévoir un suivi au moins sur quelques mois, avec quelques actions de rappel pour appuyer le message.

Question 3

L'efficacité d'une action ou d'un plan de communication, c'est :

- ☒ Le rapport « *résultats / moyens mis en place* »
☐ Le rapport « *résultats / objectifs fixés en amont* »

-  L'efficacité est proche de la notion de retour sur investissement : il s'agit du rapport entre la performance et les moyens engagés.

Question 4

Si une action de communication a coûté 1000 €, et généré 1500 € de chiffre d'affaires, le ROI est de :

- ☐ 5 %
☒ 50 %
☐ 500 %

-  $\text{ROI de l'opération} = (1500 - 1000) / 1000 = 0,5$ soit 50 %.

Question 5

À la fin du projet de communication, le chef de projet organise une réunion pour recueillir les *feedbacks* de ses collaborateurs sur le déroulement du projet. Cette phase s'appelle :

- ☐ La phase finale
☐ Le brief
☒ Le debrief

-  Le recueil des *feedbacks* et pistes d'amélioration des collaborateurs à l'issue d'un projet de communication est appelé le « *debrief* ».

Exercice p. Solution n°4

Tâches	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
Préparer les visuels de l'événement						
Relayer l'événement sur les réseaux sociaux						
Sponsoriser les publications réseaux sociaux						
Envoyer les invitations						
Rédiger le communiqué de presse						
Envoyer le communiqué de presse						
Préparer la soirée d'inauguration						
Accueillir les invités pour l'inauguration						

Exercice p. Solution n°5

Tâches	Aicha	Julien	Équipe web
Préparer les visuels de l'événement	Validation	Responsable	
Relayer l'événement sur les réseaux sociaux	Validation	Acteur	Responsable
Sponsoriser les publications réseaux sociaux	Validation		Responsable
Envoyer les invitations	Responsable		
Rédiger le communiqué de presse	Responsable		
Envoyer le communiqué de presse	Responsable		
Préparer la soirée d'inauguration	Responsable		
Accueillir les invités pour l'inauguration	Responsable		

Exercice p. 14 Solution n°6

Exercice

Dans quelle phase du projet de communication fait-on la répartition des tâches ?

- ☒ La phase de cadrage
- ☐ La phase de *feedback*
- ☐ La phase de pilotage
-  La répartition des tâches se fait avant de passer à la partie opérationnelle, c'est-à-dire dans la phase de cadrage.

Question 2

Le rétroplanning permet de :

- ☐ Définir les objectifs de chaque tâche
- ☐ Suivre les KPI et l'atteinte des objectifs
- ☒ Planifier les tâches dans le temps
-  Le rétroplanning permet de planifier toutes les tâches du projet et de les lier entre elles afin d'avoir une vision temporelle du déroulé du projet.

Question 3

La répartition des tâches par le chef de projet se fait en fonction :

- ☐ Du hasard
- ☒ Des compétences et de l'expérience de chaque membre de l'équipe
- ☐ Des affinités au sein de l'équipe
-  Le chef de projet doit prendre soin de confier chaque tâche à la personne la plus compétente pour le type de travail à réaliser, en prenant en compte son expérience.

Question 4

S'il manque une compétence dans l'équipe pour un projet particulier, la meilleure solution pour le chef de projet est de :

- ☒ Faire appel à une ou plusieurs personne(s) compétente(s) en freelance
- ☐ Demander de l'aide à un(e) ami(e)
- ☐ Demander à un des membres de l'équipe de se former sur la compétence en question
-  Dans ce cas, la solution la plus rapide et la plus fiable consiste à faire appel à un freelance.

Question 5

Comment appelle-t-on le fait de faire des comptes rendus réguliers à son supérieur ou à son client par rapport à un projet en cours ?

- ☐ Le *feedback*
- ☒ Le *reporting*
- ☐ Le retour client
-  Il s'agit du *reporting*.
